




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 181	Fecha Informe: 28-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

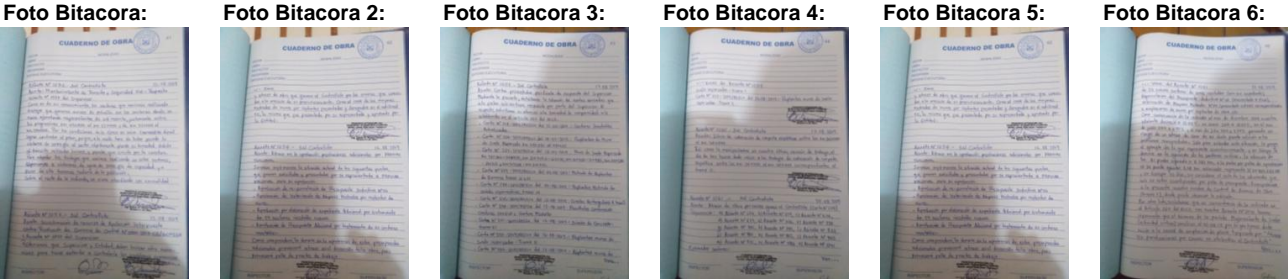

Asunto:
Visita de verificación de metrados de las actividades ejecutados en campo del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de veredas , cunetas rectangulares, trapezoidales, mandiles emboquillados , zanjas de coronación en el Tramo I.

Conclusiones:
En este día se verificó todas las actividades ejecutadas en el tramo I (progresiva 0+000 a la 21+000) por la empresa San Martín, en el tramo 2 se continua con el asfaltado de la via en la progresiva 38+000 en adelante. y el tramo III desde 52+000 en adelante se continua con la construcción de alcantarillas , cunetas,muros, mejoramientos de suelos, construcción de subbases y bases e imprimación asfáltica.

Recomendaciones:
Se recomienda a la Supervisión la entrega de su plan de trabajo semanal o programación del personal técnico y especialistas que laborará en campo y en las zonas auxiliares de trabajo.
Se recomienda al Consorcio Integración Vial o la Supervisión la entrega del resumen ejecutado a tiempo, para realizar su verificación.
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes , y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia del contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de piedras en alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 15+340 se verifica la construcción del emboquillado en la salida de la alcantarilla rectangular de triple celda.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Zona a emboquillar en los lados de alcantarilla

CDescripcion_____:

2

En la progresiva Km. 15+330 en la zona de aleros de la alcantarilla rectangular de triple celda se va a realizar el emboquilado de protección del talud.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción e zanjas emboquilladas

CDescripcion_____:

3

En la progresiva Km. 14+500 se verifica la construcción de zanjas emboquilladas de coronación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-08-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de vereda y grada

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 0+075 Se verifica la construcción de vereda de concreto y grada en el Poblado de Pizana. (margen derecho de la vía.)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-08-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48 "

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 1+380 se verifica la construcción de emboquillado en la entrada de alcantarilla TMC de 48 "

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado en alcantarilla cuadrada de concreto

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 1+550 se verifica la construcción de emboquillado de piedras en la entrada de la alcantarilla de concreto.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-08-2019

Actividades:
Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de zanjas de coronación (L=65m)

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 11+720 se verifica la eejcución de zanjas de coronamiento de tierra en una longitud aproximada de 65 m.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 14+433 se verifica la construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48 ". La supervisión realizó observación al trabajo ejecutado puesto que no estaba ejecutado la limpieza, conformación y el encauzamiento de la quebrada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-08-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-08-2019

Actividades:
Visita de verificación en zona critica; Area de talud en quebrada de la polvora

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 15+380 Se realizo el recorrido en la zona critica en el Poblado de la Polvora donde se verifica el nivel de socavación del talud cercano a la zona asfaltada.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-08-2019
