



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA

Pública Regional Descentralizada

RENDICIÓN DE CUENTAS
HUANTA 2013



Resumen Ejecutivo



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

PRESENTACIÓN

La Presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión transparente y participativa, se complace en presentar la I Audiencia Pública Regional Descentralizada 2013 a toda la comunidad ayacuchana, donde se mostrará los logros y resultados de la gestión institucional alcanzados correspondiente al periodo enero a julio del presente.

Las actividades durante este año se han orientado a dar continuidad a los proyectos iniciados en el ejercicio fiscal 2012, en el marco de los lineamientos de gestión establecidos para el periodo 2011-2014, dando prioridad a aquéllos que tienen importancia estratégica para el desarrollo de nuestra región.

En tal sentido, los logros mostrados en el presente informe tienen correlación con el Programa de Inversiones 2012, a fin de dar coherencia a las intervenciones del Gobierno Regional y contribuir a la mejora de la calidad de la inversión pública regional. Para mayor detalle, dichos logros se muestran de acuerdo a la Estructura Orgánica Funcional.

Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia y libre acceso a la información sobre la gestión regional, lo cual es coherente con el proceso de modernización y descentralización del Estado. Y una de las formas de mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los logros de la gestión, así como los problemas a los que se viene enfrentando.

En consecuencia, dejamos a vuestra consideración los logros y resultados de la gestión frente al Gobierno Regional de Ayacucho.

La Presidencia Regional



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

ÍNDICE

1. Información General.....	4
2. Actividades del Gobierno Regional	7
2.1. Alta Dirección.....	7
2.2. Gerencias Regionales.....	14
A. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.....	14
B. Gerencia Regional de Desarrollo Económico.	25
C. Gerencia Regional de Social	27
D. Gerencia Regional de Infraestructura	28
E. Gerencia Regional de RR Naturales y Gestión del Medio Ambiente	36
2.3. Direcciones Regionales	43
A. Dirección Regional Agraria	43
B. Dirección Regional de Energía y Minas	53
C. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	55
D. Dirección Regional de la Producción	61
E. Dirección Regional de Educación	63
F. Dirección Regional de Salud.....	65
G. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	69
H. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	71
2.4. PRIDER	78
2.5. OPEMAN	88
2.6. Direcciones Sub Regionales.....	88
A. Sub Región de Huanta.....	88
B. Sub Región de Lucanas.....	94
C. Sub Región de La Mar	94
D. Sub Región de Paucar de Sara Sara.....	103
E. Sub Región de Huancasancos	114
F. Sub Región de Sucre.....	114
G. Sub Región de Vilcashuamán.....	114
H. Sub Región de Víctor Fajardo.....	114






Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

I. Sub Región de Cangallo	114
J. Sub Región de Parinacochas	114
2.7. Unidades Operativas	115
A. Unidad Operativa del VRAEN.....	115
B. Unidad Operativa de las Cabezadas	126





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

RESUMEN EJECUTIVO 2013

1. INFORMACION GENERAL.-

1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL.-

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2. VISION REGIONAL.-

En su Plan Estratégico Institucional 2011-2014 el Gobierno Regional de Ayacucho ha establecido por consenso la siguiente visión regional:

“Ayacucho es una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), y que promueve la participación ciudadana como garantía de sostenibilidad y democracia”.

1.3. ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL.-

ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION

Consejo Regional

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACIÓN

Consejo de Coordinación Regional

Consejos Consultivos Regionales

Institutos Regionales

ALTA DIRECCION



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Presidencia Regional
Vicepresidencia Regional
Gerencia General Regional

ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Oficina Regional de Asesoría Jurídica

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

ORGANO DE APOYO

Oficina Regional de Administración

ORGANOS DE LINEA

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Subregionales
Unidades Operativas
Direcciones Regionales Sectoriales
Proyectos Especiales y Programas Sociales



*Gestión con vocación
de Servicio*


1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

1.4. ESCALA DE PRIORIDADES.-

La escala de prioridades establecida para el periodo de gestión 2011-2014 es la siguiente:

- Salud, nutrición y saneamiento básico
- Educación y cultura
- Desarrollo agropecuario
- Transportes y comunicaciones
- Recursos naturales y medio ambiente
- Descentralización y gobernabilidad
- Turismo y comercio exterior
- Desarrollo empresarial



Resumen Ejecutivo

2. ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL.-

2.1. ALTA DIRECCIÓN.-

A. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.-

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, HUANTA – AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- A la fecha, el Estudio de Factibilidad se encuentra en formulación
- Se prevé la Viabilización del Estudio a Nivel de Factibilidad para el próximo 31.Oct.13.

INFORMACION ADICIONAL.-

- Los Estudios de Pre Inversión está siendo formulado por la Empresa KUKOVA ING.SAC por la suma de S. 919,407.95; y, está siendo supervisado por el CONSORCIO WIRACOCHA.

Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN – PUQUIO – LUCANAS – AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- El Estudio a nivel de Perfil ha sido aprobado con fecha 22.Mayo.2013.
- A la fecha, el Estudio de Factibilidad se encuentra en formulación
- Se prevé la Viabilización del Estudio a Nivel de Factibilidad para el próximo 31.Oct.13.

INFORMACION ADICIONAL.-

- Los Estudios de Pre Inversión está siendo formulado por la Empresa CONSORCIO HOSPITAL PUQUIO por la suma de S/. 919,407.95; y, está siendo supervisado por el CONSORCIO EDDY.

Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, HUANTA – AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- El Estudio a nivel de Perfil ha sido aprobado con fecha 24.Mayo.2013.
- A la fecha, el Estudio de Factibilidad se encuentra en formulación
- Se prevé la Viabilización del Estudio a Nivel de Factibilidad para el próximo 20.Set.13.

INFORMACION ADICIONAL.-

- Los Estudios de Pre inversión está siendo formulado por el CONSORCIO HOPSITALES AYACUCHO por la suma de S/. 901,019.79; y, está siendo supervisado por el CONSORCIO SHARU.



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA – LA MAR - AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- El Estudio a nivel de Perfil ha sido aprobado con fecha 24.Mayo.2013.
- A la fecha, el Estudio de Factibilidad se encuentra en formulación
- Se prevé la Viabilización del Estudio a Nivel de Factibilidad para el próximo 31.Oct.13.



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- El Estudio a nivel de Perfil ha sido aprobado con fecha 17.Noviembre.2012.
- A la fecha, el Estudio de Factibilidad se encuentra en formulación
- Se prevé la Viabilización del Estudio a Nivel de Factibilidad para el mes de agosto 2013.

INFORMACION ADICIONAL.-

- Mediante Convenio Específico Interinstitucional GRA/OIM/001-2012, el Organismo Internacional de las Migraciones, adjudicó la Buena Pro al Concurso Público N° Proy. 001-GRA/OIM-2013.
- El Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad está siendo formulado por el CONSORCIO HOSPITAL AYACUCHO por la suma de S/. 1'152,345.60; y, está siendo supervisado provisionalmente por el Inspector de la Meta.

Resumen Ejecutivo

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO



SITUACIÓN ACTUAL.-

- El Estudio a nivel de Perfil ha sido aprobado con fecha 30.Julio.2007.
- El Informe N° 01 conteniendo los Aspectos Generales, ha sido aprobado por el Supervisor Temporal.
- El Informe N° 02 conteniendo la Identificación y Formulación, se encuentra en evaluación por el Supervisor Consorcio Libertad.
- Se prevé la conclusión para el mes de agosto.

INFORMACION ADICIONAL.-

- La Factibilidad está siendo formulado por el CONSORCIO AYACUCHO SUR CONSULTORES y está siendo supervisado por el CONSORCIO LIBERTAD.

B. OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.-

OBRA CONCLUIDA DEL CC.EE SIMOM BOLIVAR FONDO PERU ESPAÑA Y EL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



INTERVENCIONES DE LAS ONGS A TRAVÉS DE LAS FUENTES COOPERANTES- Y FINANCIAMIENTO

N°	ONG	FINANCIAMIENTO	LINEA ACCION	LUGAR
01	FONDO PERU ESPAÑA EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	S/. 1'746,137.65	Sustitucion, ampliacion y mejoramiento institucion educativa pública "Simon Bolivar"	DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA- SANTA ELENA



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

2.2. GERENCIAS REGIONALES.-

A. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2013	EJECUCIÓN	AVANCE FISICO (%)
Elaboración y evaluación de planes				
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2014	Documento.	1	Concluido	100
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 – I	Documento	1	Concluido	100
Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2012	Documento	1	Concluido	100
Guía para la elaboración del Plan Operativo Institucional de sectores	Documento	4	4	100
Presupuesto Participativo				
Acciones preparatorias para el PP-2014				
- Aprobación del Reglamento del PP-2014	Documento	1	Aprobado	100
- Aprobación del PDRC-2013-2021	Documento	1	Aprobado	100
- Talleres de capacitación descentralizadas para Agentes Participantes en 05 zonas.	Evento	5	Concluido	100
- Taller de Trabajo Regional	Evento	1	Concluido	100
- Registro del proceso del Presupuesto Participativo en el Aplicativo Informático del MEF	Registro	1	Concluido	100
- Elaboración del documento del Presupuesto Participativo Año 2014	Documento	1	Concluido	100
Seguimiento de indicadores y metas de programas presupuestales				
- Trabajos de formación de productos e	Documento	9	En	50




Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Público Regional Descentralizado

indicadores en POI de sectores			actualización	
Actividades administrativas y coyunturales				
Elaboración de documento de información estadística	Documento	N.P	1	50
Taller de capacitación a planificadores en Metodología para la elaboración de planes de desarrollo con apoyo del CEPLAN	Evento	1	Concluido	100



CANTIDAD DE PROYECTOS VIABLES ANUAL DE LOS AÑOS 2011 AL 2013


Cuadro N° 1
Cantidad de Proyectos viables por año

CANTIDAD ANUAL	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
PROYECTOS VIABLES	61	129	125

Del año 2013, la información es al 30 de junio.

Fuente: Banco de proyecto - elaboración propia

Gráfico N°01
Cantidad De Proyectos Viables Por Año

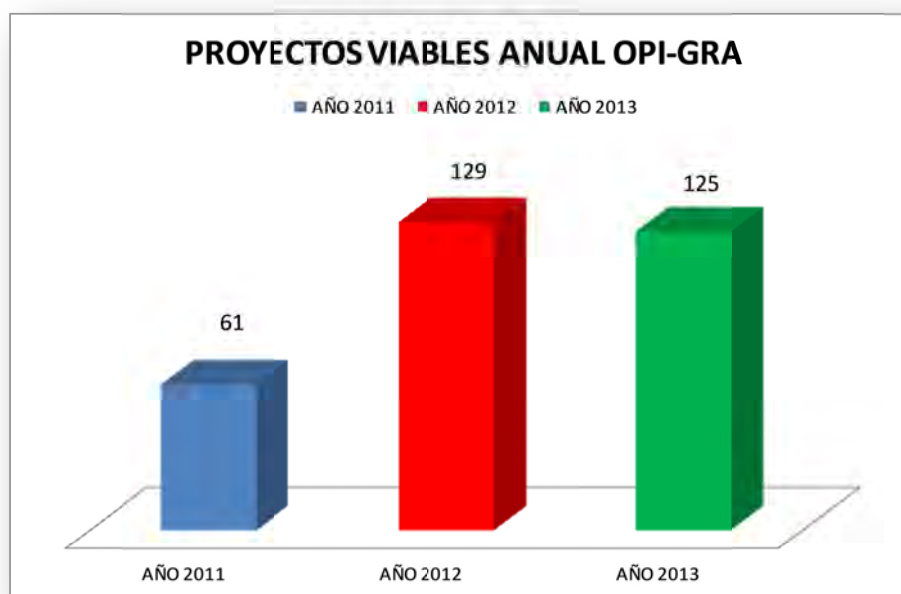



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

El cuadro y Gráfico N° 01, muestra la cantidad de proyectos declarados VIABLES por la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho en los años 2011, 2012 y 2013. Los proyectos son de competencia Regional.

PROYECTOS VIABLES SEGÚN FUNCIONES AÑO 2013

Cuadro N° 02
Proyectos por función al primer semestre 2013

PROYECTOS VIABLES AL PRIMER SEMESTRE 2013	CANTIDAD
EDUCACION	53
AGRARIA	1
SANEAMIENTO	47
TRANSPORTES	3
CULTURA Y DEPORTE	1
AGROPECUARIA	11
COMUNICACIONES	4
PLAN. GEST. Y RESV. DE CONT.	4
PROTECCION SOCIAL	1
TOTAL	125

Fuente: Banco de proyecto - elaboración

CANTIDAD DE PROYECTOS VIABLES POR AÑO 2011 AL 2013 DECLARADOS VIABLES AL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO


Cuadro N° 03
Proyectos VIABLES al primer semestre 2013

CANTIDAD AL PRIMER SEMESTRE	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
PROYECTOS VIABLES	23	45	125

Fuente: Banco de proyecto - elaboración propia

Resumen Ejecutivo

Gráfico N° 03
Proyectos VIABLES al primer semestre 2013

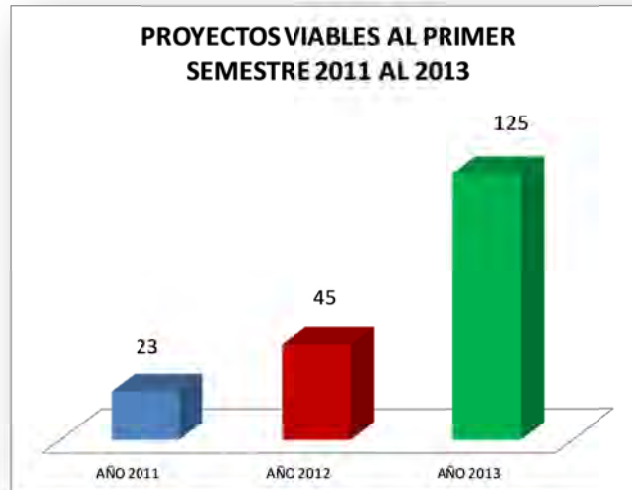

El cuadro y Gráfico N° 03, muestra la cantidad de proyectos declarados VIABLES por la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho en el año 2013, durante el primer semestre.

CANTIDAD DE PROYECTOS VIABLES AL PRIMER SEMESTRE SEGÚN MONTO DE INVERSIÓN

Cuadro N° 04
Proyectos VIABLES, según monto de Inversión al primer semestre 2013

MONTO DE INVERSIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
PIP MENOR <= 1 MILLON 200 MIL	11	27	53
PERFIL > 1 MILLON 200 MIL <= 3 MILLONES	5	7	52
PERFIL > 3 MILLONES <= 10 MILLONES	6	11	18
FACTIBILIDAD > 10 MILLONES	1	0	2
TOTAL	23	45	125

Fuente: Banco de proyecto - elaboración propia



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada


PROYECTOS EN FORMULACIÓN – EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

Cuadro Nº 05
Proyectos en situación FORMULACIÓN, según monto de Inversión al primer semestre 2013

SITUACIÓN PIPs	PRIMER SEMESTRE 2013
EN FORMULACION	18
EN EVALUACION	17
TOTAL	35

Fuente: Banco de proyecto - elaboración propia

Gráfico Nº 05
Proyectos en situación FORMULACIÓN, según monto de Inversión al primer semestre 2013

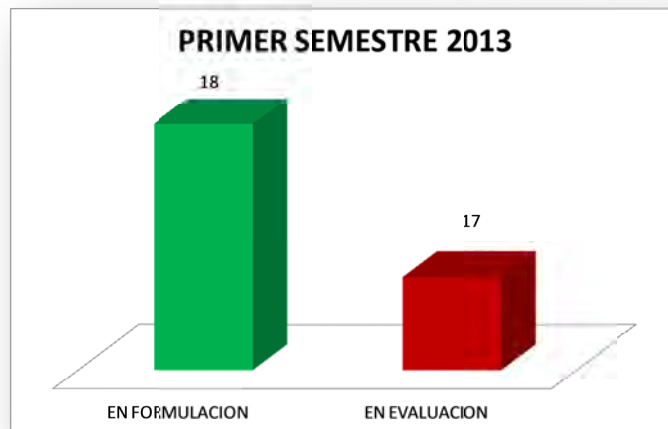

El cuadro y Gráfico Nº 05, muestra la cantidad de proyectos cuya situación al 30 de junio de 2013 se encontraban en FORMULACIÓN – EVALUACIÓN. Los mencionados proyectos serán declarados VIABLES siempre y cuando, cumplan los contenidos mínimos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública y cuando los que hayan sido observados, absuelvan las observaciones.




*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

PRINCIPALES LOGROS EN EL PRIMER SEMESTRE

1. Un incremento del 64% de proyectos viables respecto al año 2012, y un 82% de proyectos viables respecto al año 2012.
2. 522 millones 152 mil 658 nuevos soles como monto Viabilizado al primer trimestre 2013, frente a 91 millones 735 mil 625 nuevos soles que representa el 82.4% de variación.
3. 157 TDRs y/o planes de trabajo evaluados en el primer semestre 2013, respecto a 74 del año 2012. Esto representa un logro del 48% de incremento de TDRs y/o planes de trabajo APROBADOS y 53% de TDRs y/o planes de trabajo EVALUADOS (incluye observados, aprobados, rechazados).
4. Dos proyectos VIABLES de nivel Factibilidad, 04 proyectos en Formulación de nivel factibilidad, y 01 proyecto de Factibilidad en Evaluación. Quiere decir que se priorizan proyectos que generan impacto regional en los indicadores sociales.





Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

CONSOLIDADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 I SEMESTRE 2013

20

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado AL 30/06/2013	Avance PIA %	Avance PIM %
1: RECURSOS ORDINARIOS	681,518,716	848,855,584	353,079,229	52%	42%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,273,109	16,928,911	1,776,029	24%	10%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,503,579	8,801,338		17%
5: RECURSOS DETERMINADOS	67,751,831	88,623,556	33,421,643	49%	38%
TOTAL	756,543,656.00	1,004,911,630.00	397,078,239.00	52%	40%
FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF					



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo



EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2013

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Devengado AL 30/06/2013	Saldo	Avance PIA %	Avance PIM %
001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	198,883,077	320,459,465	106,120,593	214,338,872	53%	33%
008-1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON- PRIDER	71,407,718	65,736,987	30,290,725	35,446,262	42%	46%
100-771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	21,434,796	20,195,276	6,818,221	13,377,055	32%	34%
200-772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	11,971,468	14,256,265	3,042,535	11,213,730	25%	21%
300-773: REGION AYACUCHO-EDUCACION	55,636,703	58,842,281	25,227,581	33,614,700	45%	43%
301-1042: REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO	21,208,048	18,458,639	9,294,875	9,163,764	44%	50%
302-1043: REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS	38,901,048	45,431,267	22,248,619	23,182,648	57%	49%
303-1044: REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA	22,421,584	25,561,964	12,571,079	12,990,885	56%	49%
304-1351: GOB.REG. DE AYACUCHO-EDUCACION SUR PAUZA	10,788,099	12,330,885	5,831,784	6,499,101	54%	47%
305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA	35,787,337	45,842,218	19,793,666	26,048,552	55%	43%
307-1352: GOB.REG. DE AYACUCHO-EDUCACION VRAE LA MAR	30,633,682	40,203,568	17,568,968	22,634,600	57%	44%
308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO-EDUCACION HUAMANGA	79,087,549	98,998,987	44,701,310	54,297,677	57%	45%



Gestión con vocación
de Servicio


Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada


309-1377: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE	9,972,252	11,808,637	5,247,081	6,561,556	53%	44%
310-1378: GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	11,763,698	13,635,961	5,879,634	7,756,327	50%	43%
311-1440: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN	11,717,247	14,272,218	6,631,681		57%	46%
312-1493: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUANCASANCOS	0	5,353,064	1,839,430			34%
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	17,926,522	31,145,539	8,657,576		48%	28%
401-1024: REGION AYACUCHO- HOSPITAL HUAMANGA	25,250,787	35,963,777	13,176,580		52%	37%
402-1025: REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO	11,563,566	16,938,170	7,057,986		61%	42%
403-1045: REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO	14,178,217	21,106,560	9,256,418		65%	44%
404-1046: REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA	10,656,497	14,671,170	5,600,323	9,070,847	53%	38%
405-1321: REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	22,106,180	18,104,432	9,281,955	8,822,477	42%	51%
406-1362: GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA	23,247,581	32,914,626	12,915,629	19,998,997	56%	39%
407-1489: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL	0	9,938,644	3,621,880	6,316,764		36%
408-1490: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO	0	12,741,030	4,402,109	8,338,921		35%
TOTAL	756,543,656.00	1,004,911,630.00	397,078,238.00	529,673,735.00	52%	40%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF.

Resumen Ejecutivo

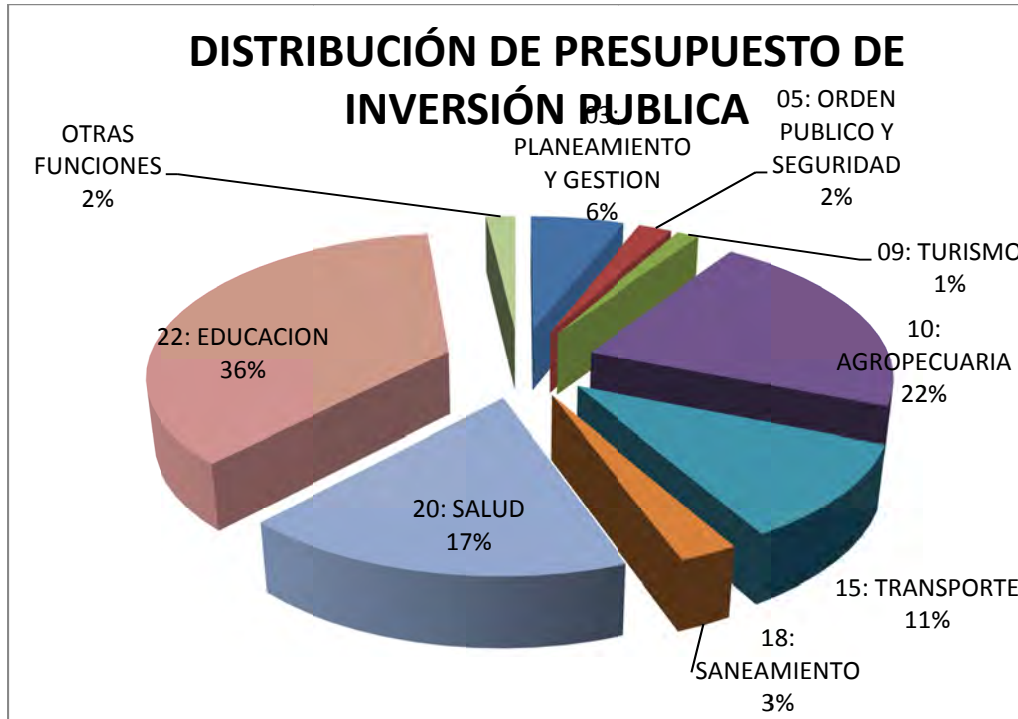

Presupuesto de Apertura para Inversión Pública del GRA 2009-2013

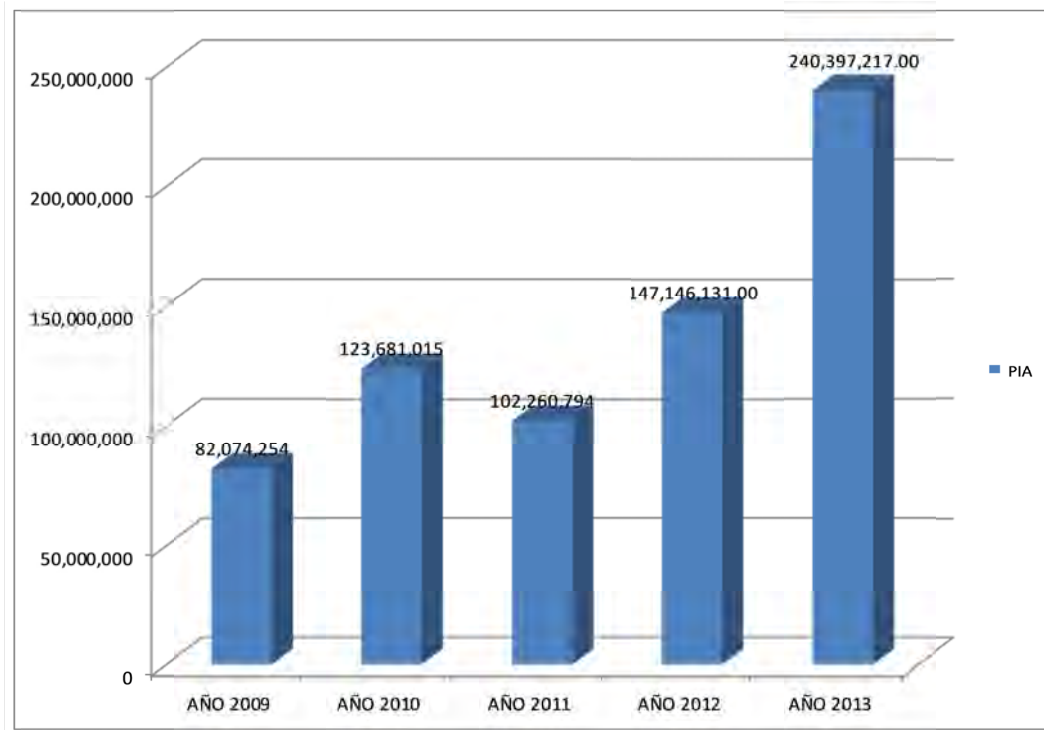




*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL TALLER CENTRAL DEL 07 DE JUNIO DEL 2013.



Fuente: Recursos Propios.



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

B. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

PROYECTOS

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN EL PRESENTE AÑO 2013 VIENE EJECUTANDO DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA:

- ❖ MEDIANTE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL: EL PROYECTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA, EN PROCESO DE EJECUCION APARTIR DEL LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, EN PROCESO DE ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS.
- ❖ MEDIANTE LA SUBGERENCIA DE MYPES E INVERSIÓN PRIVADA EL PROYECTO : DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGIÓN AYACUCHO) CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

META N° 063

OBJETIVOS: GENERAR MAYOR NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA REGION AYACUCHO.

El proyecto pretende finalmente que la región Ayacucho cuente con 13 ventanillas de información integral de las MYPES, estratégicamente descentralizado en las provincias e interconectadas a una ventanilla central situada en la Dirección Regional de la Producción. Dichas ventanillas contarán con recursos humanos especializados y capaces de brindar información absoluta actualizada y confiable, además de ofrecer asesoramiento a los empresarios en temas de gestión empresarial, comercial y formalización.

PRESUPUESTO APROBADO: 1,761709.23 NUEVOS SOLES.

- PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2013: 300,000.00 FTO: RD APROBACION DEL EXPEDIENTE

Resumen Ejecutivo

FOTOS DEL PROYECTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION AYACUCHO.

El personal del proyecto apoyando en la realización del taller programado.



FOTOS DEL PROYECTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION AYACUCHO.

Adquisición de mobiliario de oficina



C. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN.

1. Nutrición y seguridad alimentaria.
2. Gestión de la calidad de servicios de salud.
3. Gestión de la calidad de servicios educativos.
4. Igualdad de oportunidades, violencia familiar y sexual, cultura de paz.
5. Vivienda y entornos saludables.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA GRDS.

META	PROYECTO	PIM 2013
001	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN DE AYACUCHO	1,777,00.00
140	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA	220,870.00
139	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGIÓN AYACUCHO	521,283
	TOTAL PROMEDIO	2'519,153.00

PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO (S/. 274,609.00)

BENEFICIARIOS: 246 Personas con Discapacidad

AVANCE FÍSICO: 45%

AVANCE FINANCIERO: 20%





*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

D. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY-SANTA ROSA DE CCOCHA-SAN JOSE DE HUARCAYA-SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA-HUANCASANCOS-AYACUCHO

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Brindar adecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio vial terrestre continuo en las comunidades de SULCARAY-SANTA ROSA DE CCOCHA-SAN JOSE DE HUARCAYASANTA CRUZ DE HUARCAYA, en el distrito de Santiago de Lucana marca - Provincia de Huanca Sancos- Ayacucho

COSTO DEL PROYECTO

EN NUEVOS SOLES	EN DOLARES (cambio=S/.2.80)
S/.3'595,752.79	\$ 1'282,365.47

SITUACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			SALDO TOTAL
PIA	PIM	EJEC.	PIA	PIM	EJEC.	
2'000,000	1'167,511	1'166,421	1'719,586	719,586	669,400.40	1'759,931.39

AVANCE FISICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA

DESCRIPCION	META EJECUTADA	SALDO
AVANCE FISICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA	93.03%	6.97%



Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo





Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE UTARI – LAGUNA CCALLACCOCHA – CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS – AYACUCHO

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

“FACILITAR EL ACCESO DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CHACLACCNIYOCC, CCALLACCOCHA, HUANZO, UTARI Y ALREDEDORES A LOS MERCADOS LOCALES, DISTRITALES Y REGIONALES”.

COSTO DEL PROYECTO

EN NUEVOS SOLES	EN DOLARES (cambio = S/. 2.70)
S/. 4`960,918.94	\$ 1`837,377.38

SITUACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			SALDO TOTAL
PIA	PIM	EJECUTADO	PIA	PIM	EJECUTADO	
2`000,000.00	1`450,000.00	1`443,421.51	300,000.00	300,000.00	0.00	3`217,497.43

AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA

DESCRIPCION	META EJECUTADA %	SALDO%
AVANCE FISICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%)	33.62%	66.38%

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA



Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

FECHA DE CULMINACIÓN

15 - 10 - 2013





Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO, MANZANAYOCC, URABAMBA, SAN ANDRES, ESPINOZAYOCC, TACCRA, DISTRITO DE SANCOS PROVINCIA HUANCA SANCOS AYACUCHO.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Brindar adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicio vial terrestre continuo en las comunidades Pumasapo, Manzanayocc, Urabamba, San Andrés, Espinozayocc, Tacra.

COSTO DEL PROYECTO

EN NUEVOS SOLES	EN DOLARES (cambio = S/. 2.80)
S/. 700,000.00	\$ 250,000.00

SITUACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			SALDO TOTAL
PIA	PIM	EJECUTADO	PIA	PIM	EJECUTADO	
1'200,000.00	1'200,000.00	1'199,951.95	700,000.00	700,000.00	6,857.21	4,640,414.84

AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA

DESCRIPCION	META EJECUTADA %	SALDO%
AVANCE FISICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%)	19%	81%

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

TIEMPO DE EJECUCION	120 Días (04 Meses)
FECHA DE INICIO DE OBRA	13- agosto. - 2013
FECHA DE CULMINACION	18- dic. - 2013

Resumen Ejecutivo



**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PUTICA TAULLI,
DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS-AYACUCHO.**

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto comprende la Construcción de Trocha Carrozable para la movilización o transporte de personas y mercancías de todo tipo, dentro de nuestro país se realiza, en gran parte usando vías y sistemas de transporte terrestre, siendo los más difundidos los transportes con camiones, autobuses y automóviles, que circulan por calles, avenidas y carreteras.

COSTO DEL PROYECTO

EN NUEVOS SOLES	EN DOLARES (cambio = S/. 2.80)
S/. 700,000.00	\$ 250,000.00

SITUACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			SALDO TOTAL
PIA	PIM	EJECUTADO	PIA	PIM	EJECUTA DO	
700,000.00	700,000.00	1'199,951.95			0.00	5'001,792.08



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo



Resumen Ejecutivo

AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA

DESCRIPCION	META EJECUTADA %	SALDO%
AVANCE FISICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%)	19%	81%

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

TIEMPO DE EJECUCION	120 Días (04 Meses)
FECHA DE INICIO DE OBRA	13 – agosto. – 2013
FECHA DE CULMINACION	18– dic. – 2013



Resumen Ejecutivo



CONSTRUCCION ANTIGUA DE LA I.E HIPOLITO UNANUE DE CARAPO



PROCESO DE EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE I.E HIPOLITO UNANUE DE
CARAPO



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo



INFRAESTRUCTURA CULMINADA AL 100% INCLUIDO PATIO DE HONOR DE LA I.E.
HIPOLITO UNANUE DE CARAPO



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

E. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.-

Meta: 087 “Elaboración de Estudios Del Plan de Descontaminación y Remediación Ambiental de la Cuenca Del Rio Mantaro”

Año : Ejercicio presupuestal 2013. (Actividad).

N° Beneficiarios : 139,974 Habitantes

PRINCIPALES LOGROS

Se desarrollaron instrumentos metodológicos, técnicos y administrativos que permitieron identificar las zonas de intervención de la presente Actividad.

Se ha formulado el estudio a nivel de Pre Inversión “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CACHI**”, el cual fue registrado con código SNIP 255436.

Se tiene aprobado el término de referencia para la elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de Pre Inversión “**MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN AYACUCHO**”.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

Presupuesto Total	2013	:	S/. 110,000.00
Avance Físico		:	25.22%
Avance Financiero		:	24.00%



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Proyecto: “Generación de Mecanismos y Capacidades para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica en la Región Ayacucho”

CÓDIGO SNIP : 170763
Año : Ejercicio presupuestal 2013.
Beneficiarios : 417,569 habitantes

PRINCIPALES LOGROS

- Se elaboró el Diagnostico y Análisis Normativo Legal para la Implementación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la Certificación Ambiental en el Gobierno Regional de Ayacucho.
- Se desarrolló talleres de sensibilización y capacitación en Legislación y Normatividad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, dirigida a las instituciones públicas y privadas.
- Asistencia técnica dirigida al personal técnico de las diferentes direcciones regionales del Gobierno Regional de Ayacucho para la implementación del Sistema Nacional Evaluación de Impacto Ambiental en la Región Ayacucho.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto Total	2013	:	S/. 200,000.00
Avance Físico		:	15.5%
Avance Financiero		:	20.00%

META 025: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS.

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

MONTO TOTAL DE INVERSION: S/. 876,562.00 Ochoientos Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Dos y 00/100 Nuevos Soles.



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

BENEFICIARIOS: La Población Beneficiaria está enfocada a nivel de las 11 Provincias, 111 Distritos del Ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho, un aproximado de 653,000 personas.

AVANCE FISICO: A la Fecha se Logró un Avance Físico de 39%

AVANCE FINANCIERO: En la Ejecución Presupuestal se logró Un avance de 29 % que corresponde a un monto ejecutado de S/. 256,426.80 Soles.

META: 0142 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES DE LA REGIÓN AYACUCHO

Monto de inversión : S/. 833,842.50

Beneficiarios : Población de 1825 personas

Avance físico : Se tiene un avance físico de **82 %**.

Avance financiero : **S/. 636,260.76**, en porcentaje es **76.30 %**

Código SNIP : 151035

ÁMBITO DE DEL PROYECTO:

El ámbito del trabajo es a nivel regional, contemplando las 11 provincias y 112 distritos.

Provincia : Multiprovincial

Distrito : Multidistrital

AVANCES A LA FECHA:

- Se tiene la página web alojado en el portal web del Gobierno Regional de Ayacucho <http://www.regionayacucho.gob.pe/gra/>, con un servidor a dedicación exclusiva; ubicado en la Oficina de Informática del Gobierno Regional de Ayacucho.

Resumen Ejecutivo






Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

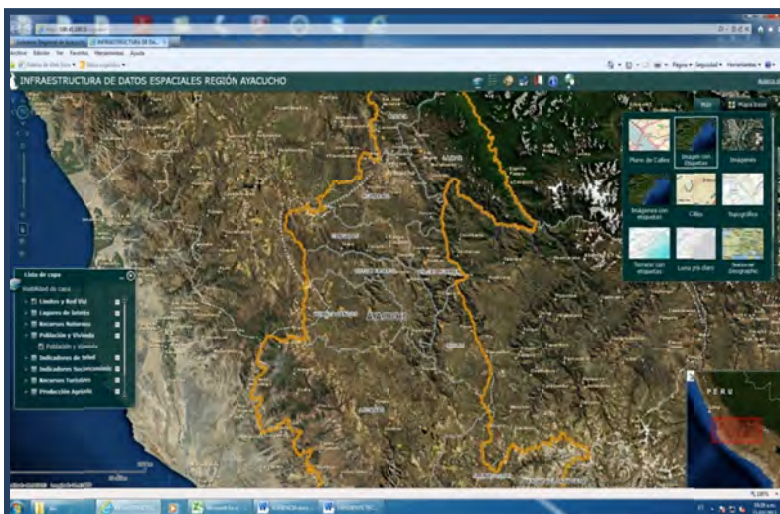

in
encias

META 0204: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CREACION Y GESTION DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DEL ÁMBITO DE LA CUENCA CACHI

MONTO TOTAL DE INVERSION: S/. 284,173.00 Doscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y tres soles.

BENEFICIARIOS: Población de los distritos de Vinchos, Paras de la provincia de Huamanga y los distritos de Morochucos y Chuschi de la provincia de Cangallo, que pertenecen a las cuencas Paqcha, Apacheta, Chicllarazu y la intercuenca Vinchos.

AVANCE FISICO: Se logró un resultado de avance físico obtenido de 54.05 % en base a lo programado en el expediente técnico general.

Resumen Ejecutivo

AVANCE FINANCIERO: Se logró un resultado de avance financiero de 50.53 % que corresponde a un monto ejecutado de S/.143, 606.00 Soles, en base a lo programado en el expediente técnico general.

CODIGO SNIP: 123029



Exposición sobre Áreas de Conservación Regionales y beneficios





*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

Representantes de las comunidades y Centros Poblados del distrito de Chuschi.



Reunión de Coordinación con las 13 comunidades de la Cuenca Alta.

Resumen Ejecutivo

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ZONIFICACION ECOLOGICA, ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION AYACUCHO”.

Código SNIP: El código SNIP asignado al proyecto es el 125444

Monto de Inversión: S/.4,563.084.44

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son las 11 provincias del departamento de Ayacucho y sus 111 distritos.

Avance Físico y Financiero: En el presente año se tiene un monto presupuestado de **S/. 420,038.00** nuevos soles.

Cuadro N° 01: Resumen del avance físico financiero del proyecto.

Ejecutado 2009 S/.	Ejecutado 2010 S/.	Ejecutado 2011 S/.	Ejecutado 2012 S/.	Ejecutado 2013 S/.	Total S/.	Saldo Actual S/.	Avance financiero S/.	Avance físico S/.
99,701.00	182,907.49	764,375.94	481,896.21	193,949.50	2,220,038.00	1,722,830.14	77.6	90°°

Fuente: Preliquidaciones anuales



Foto N°01: Reuniones con funcionarios del MINAM y el GRA.





*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

FOTO N°02: Reunión de aprobación de la ZEEOT





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

2.3. DIRECCIONES REGIONALES.-

A. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA.-

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL SECTOR AL PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO			%
	PIA	PIM	EJECUTADO I SEMESTRE 2013	
GASTOS CORRIENTES				
Personal y Obligaciones Sociales	7,264,948.00	7,291,140.00	3,514,165.27	48.20
Pensiones y Otras Prestaciones	1,503,636.00	1,530,336.00	693,900.34	45.34
Bienes y Servicios	2,516,212.00	2,579,209.00	1,253,030.79	48.58
Otros Gastos		125,811.00	118,202.12	93.95
GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL	11,284,796.00	11,526,496.0	5,579,298.52	48.4

CONCEPTO	PRESUPUESTO			%
	PIA	PIM	EJECUTADO I SEMESTRE 2013	
INVERSION				
Proyectos de Inversión Pública	10,000,000.00	8,392,963.00	1,131,347.35	13.48
TOTAL	10,000,000.0	8,392,963.0	1,131,347.35	13.48

PRINCIPALES LOGROS DEL SECTOR EN EL PRIMER SEMESTRE

Proyecto: "PRODUCCIÓN AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGIÓN DE AYACUCHO CON CÓDIGO SNIP 48178, META 10

Ubicación de viveros	Pomacocha, Carhuana, Concepción (Vilcas Huamán); Qichawa, Accosa (Huancasancos); Ocros, AcosVinchos,
----------------------	--



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

	Canaan (Huamanga); Cora Cora, Pueblo Nuevo (Parinacochas) y Puquio, Santa Ana de Puquio (Lucanas), Cangallo, Chuschi, Paras (Cangallo); Colta, Ushua, Marcabamba (Paucar del Sara Sara); Ayahuanco (Huanta); Morcolla, Chalcos (Sucre); Alcamenca, Hualla (Fajardo).				
Ppto. Inicial Aprobado	S/. 4'297,630.00	Fuente de Financiamiento	Gobierno Regional Ayacucho		
Meta Física Total	4,250 Has.	Inicio de Proyecto	Año 2009		
Ppto. ejecutado al 2012.	S/. 2.199.110,00	Meta Física al 2012	1,815.0 Has. 22 parcelas demostrativas		
META 2013					
Presupuesto Anual 2013	S/. 1.208.947,000 (S/. 808.947,00)	Plazo de Ejecución	09 meses		
Fecha de Inicio 2013	09 de mayo	Número de Beneficiarios	600 – 1000 familias		
Meta Física a JUNIO	<ul style="list-style-type: none"> • Corte y excavación en terreno normal al 100% (934,40 m3.) • Nivelación y apisonado al 100 % (18688,00 m2.) • Trazo y replanteo al 100 % (18688,00 m2.) • Construcción de camas de almacigo al 100 %. • Construcción de camas de repique 3,747,00 m2. • Construcción de tinglado en camas de repique = 3591,00 m2. • Protección del perímetro del tinglado = 221,00 m.l. • Preparación de sustratos para camas de almacigo = 60,00 m3. • Preparación de sustrato para camas de repique = 1644,00 m3. • Embolsado de sustrato = 105.860,00 bolsas. • Enfilado de bolsas = 105.860,00 bolsas. • 1789 jornales. 				
% de Avance a JUNIO	Físico	Del mes	27,52 %	Acumulado	31,77 %
	Financiero	Del mes	18,57 %	Acumulado	23,62 %
CONCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Se tiene un avance físico del mes un 27,52% y financiero 18,57 %. • Se concluyo al 100% con la excavación, nivelación, construcción de camas de almacigo. • Preparación de sustratos, enfilado, embolsado, etc, • Construcción del tinglado. 				



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

- Protección del perímetro del tinglado.

Proyecto: “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN LA REGIÓN DE AYACUCHO CON CÓDIGO SNIP 75287, META 08

Ubicación Invernadero Almacén	Manallasaq)Chiara; Morochucos (Cangallo); INIA almacén			
Ppto. Inicial Aprobado	S/. 5'332,159.49	Fuente de Financiamiento	Gobierno Regional Ayacucho	
Meta Física Total	1110 has Producción de semillas, Invernaderos, Capacitación.		Inicio de Proyecto	Año 2008
Ppto. Ejecutado al 2012.	S/. 1'751,243.66	Meta Física al 2012	171 Has.	
META 2013				
Presupuesto Anual 2013	S/. 1'000,000 (S/. 700.000,00)	Plazo de Ejecución	09 meses	
Fecha de Inicio 2013	06 de Mayo	Número de Beneficiarios	500 familias	
Meta Física a JUNIO	<ul style="list-style-type: none"> • 01 mes de asistencia técnica en tecnología productiva (SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS) y recuperación de semillas de papa (Yungay, Canchan y Peruanita) en una cantidad total de 6.518,00 kilos (CAMPAÑA 2012-2013). • Términos de referencia para el proceso de selección de la construcción de invernaderos y almacén • 01 festival gastronómico • Inspección y verificación de las construcciones del invernadero y almacén en 			



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

	las provincias de Vilcashuaman, Sucre y Huancasancos.				
% de Avance a JUNIO	Físico	Del mes	4.94 %	Acumulado	9.04 %
	Financiero	Del mes	6.70 % (S/. 66.962,06)	Acumulado	14,25 % (S/. 142.542,62)
CONCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto se encuentra a nivel de adquisición de materiales puestos en obra para la construcción de 03 almacenes y 02 Invernaderos (ladrillos y agregados) y el resto por contrata a mano alzada y/o a todo costo.. • 01 Asistencia en tecnología productiva. (recuperación de semillas) • 01 festival gastronómico. 				

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA REGIÓN AYACUCHO” SNIP 213363, META 15.

Distrito (s)	Huamanga: Acocro, Tambillo, Vinchos, Chiara y Socos Lucanas: Puquio, San Pedro y San Juan. Cangallo: Cangallo, Morochucos y Chuschi. Sucre: Huacaña, Morcolla y Querobamaba. Vilcashuaman: Vilcas y VischongoV. Fajardo: Alcamenca, Cayara, Huancapi, Huancaraylla. Huancasancos: Carapo, Sacsamarca y Huancasancos. Huanta: Iguain Santillana. Parinacochas: Coracora, Chumpi, Incuyo.			
Ppto. Inicial Aprobado	S/. 8'066,847.00	Fuente de Financiamiento	Gobierno Regional Ayacucho	
Meta Física Total	561 has parcelas demostrativas, 165 Ecas con 220 sesiones.		Inicio de Proyecto	Año 2012
Ppto. Ejecutado al 2012.	S/. 2793084.20		Meta Física al 2012	561.0 Has.
META 2013				




Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Presupuesto Anual 2013	S/. 2'357,734.00		Plazo de Ejecución	09 meses	
Fecha de Inicio 2013	25 abril del 2013		Número de Beneficiarios	4,087 familias	
Meta Física a JUNIO	<ul style="list-style-type: none"> • 04 Has. Parcelas de demostración acumulada. • 05 Ton. Parcela demostrativa valor agregado, transformación y comercialización (acumulado) • 01 mes de asistencia técnica de 09 especialistas en producción, 19 técnicos de campo, 11 promotores, 01 especialista en comercialización, 01 especialista en sistematización de información, 02 especialistas en agroindustrias, 02 especialistas en organización en temas de cosecha, post cosecha, transformación y estudio de mercado.. • 02,50 evento de feria local (La mar –Tambo y Cangallo) y regionales (Huamanga). • 01 curso de programa de comercialización. • 16.019,00 Kgs. De semilla recuperados de la campaña 2012-2013 entre las variedades Blanca, Roja Pasancalla y Negra. 				
% de Avance a MAYO	Físico	Del mes	5,27 %	Acumulado	9,57 %
	Financiero	Del mes	5,27 %	Acumulado	9,58 %
CONCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto se encuentra con un avance físico acumulado del 9,57 %. • Preparación de terreno acumulado 4,00 Has de 561has. • En los procesos de adquisiciones existen mucha demora. 				





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS PROVINCIA DE LUCANAS, REGIÓN AYACUCHO” Código SNIP 93521, Meta 12

Provincia	Lucanas			
Ubicación de viveros	01 Vivero Huac-huas (Socos) 02 Vivero Llauta (Pucurí y Collanco) 01 Vivero Laramate (Galluyoc) 01 Vivero Ocaña (Ocaña) 01 Vivero San Pedro de Palco (Palco) 01 Vivero Otoa (Otoa) 01 Vivero Leoncio Prado (Pirca Grande) 01 Vivero Saisa (Lisahuacchi) 01 Vivero Santa Lucia (Huanca)			
Ppto. Inicial Aprobado	S/. 2'255,686.87	Financiamiento	GRA S/.1'600,855.00 Beneficiarios S/.654,831.87	
Meta Física Total	1000 Has.	Inicio del Proyecto	2010	
Meta Ejecutado al 2012.	1'359,858.77	GRA: S/. S/.1'200,000.00 Benef: S/.159,858.77	Física	618 has
META 2013				
Presupuesto Anual 2013	S/. 796,530	Plazo de Ejecución	08 meses	
Fecha de Inicio 2013	08 de mayo	Nº de	2,000	



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

				Beneficiarios	Familias
Meta Física a JUNIO		<ul style="list-style-type: none"> • Labores culturales en el vivero (instalación de postes de rollizos) • Prestación de asistencia técnica • Ejecución física del mes 17,60 % • 151 familias beneficiarias 			
% de Avance a JUNIO	Físico	Del Mes	17,60 %	Acumulado	19,70 %
	Financiero	Del Mes	14,75 %	Acumulado	17,41 %
CONCLUSIÓN		<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto se encuentra en ejecución • Labores culturales en el vivero • Ejecución física del mes es de 17,60 % • Compra de insumos y materiales (en proceso semillas y yemas) 			

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE TUNA EN LA REGIÓN AYACUCHO” Código SNIP 122173, Meta 11

Provincia	Huamanga, Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos, Sucre, Lucanas, Paucar del Sara Sara.		
Ppto. Inicial Aprobado	S/. 5'606,347.70	Inicio del Proyecto	2010
Meta Física Total	4480 Has Plantaciones y Recalce y Producción de 280,000 Plántulas.		
Ppto. Ejecutado al	S/. 1'643,025	Meta Física al 2012	<ul style="list-style-type: none"> • 1330 Has Plantaciones y recalce.




Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

2012.					<ul style="list-style-type: none"> 37 Parcelas Demostrativas
META ANUAL 2013					
Presupuesto Anual 2013		S/. 1.000.000,00 (S/. 800.000,00)		Plazo de Ejecución	10 meses
Fecha de Inicio 2012		27 de Abril 2013		Nº Beneficiarios	1620 Familias
Meta Física JUNIO	<ul style="list-style-type: none"> 83,75 Has podas de rehabilitación del mes. 01 mes de prestación de asistencia profesional 0.06 evento de Promoción de Feria y Festivales de Tuna. 580 jornales (Huamanga, Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo, Huancasancos, Sucre.) 				
% de Avance a JUNIO	Físico	Del Mes	6,37 %	Acumulado	10,75 %
	Financiero	Del Mes	6,25 %	Acumulado	10,91 %
CONCLUSIONES	<ul style="list-style-type: none"> 83,75 Has. De poda de rehabilitación. 01 prestación de asistencia profesional 01 mes de prestación de asistencia técnica. 0.06 promoción de feria y festival de tuna. El avance físico del mes es de 6,37%. 				



Resumen Ejecutivo

DOSIFICACION DE GANADO VACUNO



ESTABLECIMIENTO DE TUNA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA



SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE PLANTONES DE TARA EN VIVERO, PROYECTO FORESTAL,
LOCALIDAD DE HUANCAPI

Resumen Ejecutivo



SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE PLANTONES DE PINO EN VIVERO, PROYECTO FORESTAL,
LOCALIDAD DE COLCA



Resumen Ejecutivo

B. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS.-

ACTIVIDADES.

1. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN A TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN MINERA INFORMAL

Lugar: Quebrada Liriochayocc de la comunidad de Potongo del distrito de San Salvador de Quije de la Provincia de Sucre, Región Ayacucho.



Proceso

2. PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS EN EVENTO DE CAPACITACIÓN EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Evento realizado en la Provincia de Sucre:

Objetivo:

Proceso de capacitación de Pequeña Minería y Minería Artesanal en cumplimiento del D.L N° 1105.

Resumen Ejecutivo



3. PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS MONITOREO PARTICIPATIVO DE AGUA UNIDAD OPERATIVA PALLANCATA, MINERA SUYAMARCA S.A.C.





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

C. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.-

META: 043 "GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL – INDUSTRIA COMERCIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
TOTAL		
RECURSOS ORDINARIOS	85,533.00	150,00.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,000.00	

Y SERVICIOS".

❖ **Nombre del Proyecto:**

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGIÓN DE AYACUCHO" – 2013

❖ **Monto de Inversión:**

<i>Año</i>	<i>Presupuesto</i>
<i>2012</i>	<i>1,888,167.00</i>
<i>2013</i>	<i>1,111,834.00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>3,000,001.00</i>

❖ **Número de Beneficiarios:**

2,715

❖ **Avance Físico al 12-07-2013:**

Resumen Ejecutivo

Mes	Meta Física/Actividades Ejecutadas	Porcentaje de Avance
Febrero	10.00	11.90%
Marzo	6.00	7.14%
Abril	6.00	7.14%
Mayo	9.00	10.71%
Junio	5.00	5.95%
Julio	3.00	3.57%
% de Avance	39.00	46.43%

❖ Avance Financiero al 12-07-2013:

RESUMEN MENSUALIZADO : 1,111,834.00				
Meses - 2013	Nivel de Ejecución			
	Órdenes	Compromiso	Devengado	Girado
2: 'Febrero	45,921.00	1,078.00	0.00	0.00
3: 'Marzo	122,084.00	86,348.00	43,611.00	20,058.00
4: 'Abril	311,002.50	192,348.17	187,273.17	165,916.50
5: 'Mayo	117,224.34	79,634.67	98,042.67	131,126.00
6: 'Junio	28,962.70	59,213.70	67,254.00	68,398.33
7: 'Julio	11,247.70	20,667.00	8,420.00	19,102.00
Monto Total Afectado S/.	636,442.24	439,289.54	404,600.84	404,600.83
Porcentaje de Avance Anual (%)	57.24%	39.51%	36.39%	36.39%

❖ Código SNIP:

195771

❖ Memoria Descriptiva:

1.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE ECOTURISMO



1.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE

Resumen Ejecutivo



1.3 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SELECTIVA

- ❖ elección y coronación de la mujer más hermosa del Carnaval Ayacuchano



- ❖ lanzamiento del Carnaval Ayacuchano en la ciudad de Lima

Resumen Ejecutivo



1.4 ASISTENCIA TECNICA EN MOTIVACIÓN TURISTICA



META: 0202 “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO WARI-HUAMANGA-AYACUCHO”

❖ **Nombre del Proyecto:**

“MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO WARI-HUAMANGA-AYACUCHO”

❖ **Monto de Inversión:**

Número de los Beneficiarios Directos 24,139 (N° de personas)

❖ **Número**



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

de Beneficiarios:

❖ Avance Físico al 12-07-2013:

Mes	Meta Física/Actividades Ejecutadas	Porcentaje de Avance
Febrero	0.00	0.00%
Marzo	0.00	0.00%
Abril	0.00	0.00%
Mayo	1.50	3.75%
Junio	2.50	6.25%
Julio	2.00	5.00%
% de Avance Total	6.00	15.00%
Meta Total	40.00	100.00%

❖ Avance Financiero al 12-07-2013:

CODIGO ANALITI	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE LA META	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION JULIO	TOTAL EJECUCION	AVANCE (%)	SALDO S/.
2.6.71.61	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	170,676.00	0.00	20281.67	0.00	20281.67	11.88%	150,394.3
2.6.71.62	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	83,207.00	0.00	6,166.00	12021.00	18187.00	21.86%	65,020.0
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	246,117.00	20850.00	5,709.00	0.00	26559.00	10.79%	219,558.0
T O T A L (S/.)		500,000.00	20,850.00	32,156.67	12,021.00	65,027.67	13.01%	434,972.33

❖ Código SNIP:

243353

Resumen Ejecutivo



Estructura en forma "D" en el sector VegachayoqMoqo.



Levantamiento topográfico de subsectores a intervenir.



Identificación de los subsectores.

Resumen Ejecutivo



Palabras del Presidente de la Región de Ayacucho Wilfredo Ocorima Núñez



Población participante en el lanzamiento del proyecto, tanto de la ciudad de Ayacucho, Pacaycasa, Quinua y otros.

Resumen Ejecutivo

D. DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.-

EJECUCIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE (EN NUEVOS SOLES)

META	DENOMINACIÓN	PIM	COMPROMISO	SALDO	%
034	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA	229,210	89,546	139664	39.07%
029	GESTION DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	368,465	144,707	221,558	39.27%
030	PRODUCCIÓN DE OVAS, ALEVINOS Y TRUCHAS	568,988	98,069	470,919	17.24%



Evaluación de recursos hídricos a nivel de la región.

Resumen Ejecutivo



Inspección de piscigranjas de jaula flotante laguna de Yaurihuirí -Puquio



Inspección de piscigranjas Vrae.



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

E. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN.-

PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA DREA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 (Al 12 de Julio 2013)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%EJECUCION
Recursos Ordinarios	271'837,173.00	386'720,873.00	181'048,558.00	46.8%
Recursos Directamente Recaudados	696,807.00	1'127,384.00	154,923.00	13.7%
Donaciones y Transferencias	0.00	25,051.00	0.00	0.0%
Recursos Determinados	0.00	1'683,784.00	43,478.00	2.6%
TOTAL	272'533,980.00	389'557,092.00	181'246,959.00	46.53%

PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 091 “INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”:

- ✓ **PRODUCTO:** Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada, producto que a su vez ejecuta tres actividades de suma importancia:



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROVINCIA	N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES		
	Meta Programada		Presupuesto (PIM) S/.
	Inicial	Secundaria	
Cangallo y Huancasancos	6		105,000.00
Lucanas	6		90,000.00
Parinacochas	14		210,000.00
Paucar del Sarasara	2		30,000.00
Huanta	20	3	345,600.00
La Mar	20		300,000.00
Huamanga	30		450,000.00
Sucre	10		150,000.00
Víctor Fajardo	2		30,000.00
Vilcashuamán	7		105,000.00
TOTAL	117	3	1,815,600.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL A NIVEL REGIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 090 "LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR"

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
3000001: ACCIONES COMUNES	1,905,827	1,905,828	557,467	29.25
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	233,651,830	272,574,895	132,868,239	48.75
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	4,465,876	4,465,875	2,102,028	47.07
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES	3,383,258	3,383,258	998,524	29.51
TOTAL	243,406,791	282,329,856	136,526,258	48.36

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 091 "INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR"

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	0	1,802,000	282,500	15.68
3000276: NIÑOS Y ADOLESCENTES ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA	2,278,735	476,735	104,009	21.82
TOTAL	2,278,735.00	2,278,735.00	386,509.00	16.96

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
3000462: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEGURA	286,259	923,572	211,738	22.93
TOTAL	286,259	923,572	211,738	22.93

F. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

Logros 2013 Región Ayacucho:

- Se implementó un HOGAR MATERNO REGIONAL, a la fecha reporta los siguientes datos



REPORTE DE USO DEL HOGAR MATERNO REGIONAL DIRESA AYACUCHO

PERIODO: DICIEMBRE 2012- JUNIO 2013				
USUARIAS			TIPO DE PARTO	
Nº GESTANTES	Nº PUERPERAS .	TOTAL	CESAREA	EUTOCICO
58	12	70	30	28

FUENTE: CUADERNO DE REGISTRO DEL HOGAR MATERNO REGIONAL



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo





Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo



EJECUCION PRESUPUESTAL AL 13-07-2013

Unidad Ejecutora 400-774: REGION AYACUCHO-SALUD

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	17,126,522	20,391,866	14,468,594	14,018,443	10,442,346	7,979,387	7,935,254	39.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800,000	3,070,371	479,472	478,280	285,956	283,980	283,980	9.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,504,862	2,811,585	1,837,214	1,490,449	986,693	986,693	13.1
TOTAL	17,926,522	30,967,099	17,759,651	16,333,937	12,218,751	9,250,060	9,205,927	29.7

Función	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
20: SALUD	14,808,208	27,793,585	14,646,337	13,220,726	10,297,136	7,426,204	7,426,204	26.7
24: PREVISION SOCIAL	3,118,314	3,173,514	3,113,314	3,113,211	1,921,615	1,823,855	1,779,722	56.1
TOTAL	17,926,522	30,967,099	17,759,651	16,333,937	12,218,751	9,250,059	9,205,926	29.7



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,256,130	3,132,497	638,604	627,742	431,186	409,833	409,833	13.1
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	742,826	4,068,656	3,655,434	3,651,949	3,534,444	1,337,724	1,337,724	32.9
0016: TBC-VIH/SIDA	168,280	188,101	125,590	124,755	105,602	88,278	88,278	46.9
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	136,805	151,852	63,791	63,676	54,399	45,030	45,030	29.7
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	231,883	244,473	136,007	128,267	83,134	80,110	80,110	32.8
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	138,449	150,449	73,048	71,055	50,265	29,898	29,898	19.9
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	190,000	137,701	137,701	63,532	57,005	57,005	30.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,342,641	801,842	122,039	122,039	88,023	26,322	26,322	3.3
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,383,677	1,383,677	609,994	349,994	30,123	25,250	25,250	1.8
9001: ACCIONES CENTRALES	5,236,130	5,335,175	3,794,157	3,660,578	2,461,469	2,446,488	2,446,488	45.9



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
 Pública Regional Descentralizada

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	7,289,701	15,320,377	8,403,285	7,396,182	5,316,574	4,704,122	4,659,989	30.4
TOTAL	17,926,522	30,967,099	17,759,650	16,333,938	12,218,751	9,250,060	9,205,927	29.7
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso o Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso o Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,282,455	7,452,723	4,833,622	4,801,222	3,560,003	3,559,992	3,559,992	47.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,118,314	3,387,714	3,327,514	3,327,411	2,135,815	2,038,055	1,993,922	58.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,035,130	15,320,702	6,019,616	4,975,522	3,293,150	2,641,680	2,641,680	17.2
5-25: OTROS GASTOS	0	45,258	45,258	45,258	45,258	45,258	45,258	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,490,623	4,760,702	3,533,642	3,184,525	3,184,525	965,075	965,075	20.3
TOTAL	17,926,522	30,967,099	17,759,652	16,333,938	12,218,751	9,250,060	9,205,927	29.7



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

G. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.-

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL JUNIO 2013

00 RECURSOS ORDINARIOS :	S/. 563 635.00	78.98%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS :	S/. <u>150 000.00</u>	21.02%
TOTAL	713 635.00	100.00%

INSPECCIONES LABORALES

La Sub Dirección de Inspecciones Laborales, Higiene, Seguridad Ocupacional, Asesoría y Orientación Legal, cumple la función de fomentar, difundir, supervisar y/o fiscalizar mediante la Inspección del Trabajo el cumplimiento de las normas laborales.

- **Se ha generado 405 Órdenes de Fiscalización Laboral, logrando incorporar y/o registrar en la planilla de los empleadores a 538 trabajadores**, lo que implica que dichos trabajadores gocen a partir del registro en las planillas del empleador de todos los derechos laborales.
- **69 Actas de Infracción, los mismos que se han materializado en 29 Resoluciones de multa** contra las empresas infractoras por incumplimiento de las normas socio laborales y de la seguridad social.

Resumen Ejecutivo



- Las multas impuestas a las empresas infractoras por concepto de infracciones a normas socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo, hasta mediados del mes de junio -2013 ascienden al monto total de **S/. 264,238.50(DOSCIENTOS SESENTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRENTIOCHO Y 50/100 NUEVOS SOLES)**, de los cuales, hasta la fecha, se ha recaudado la suma ascendente a **S/ 79,278.01 (SETENTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTIOCHO Y 01/100 NUEVOS SOLES)**, toda vez que muchos de las empresas sancionadas han recurrido, en vías de apelación y nulidad de oficio a la instancia superior, así como al órgano jurisdiccional.
- Hasta la fecha, el Sub Director de Inspecciones Laborales ha absuelto 293 consultas laborales.

Resumen Ejecutivo

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS:

Parcial	624
Temporal	4,433
Contrato de personal extranjero	09
Reglamento interno	04
Alto Riesgo	01
Autorización de Planilla	02
TOTAL	5,073



Feria informativa de los servicios que brinda la VUPE realizado en el mes de abril en la ciudad de Ayacucho.



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

H. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.-

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES:

ACTIVIDADES	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADA	META FINANCIERA EJECUTADA
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Cangallo	121.89 KM	589,580.27	2.50	15,863.18
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Huancasancos.	43.35 KM	209,559.45	0.00	0.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Huanta	94.14 KM	571,605.40	7.00	41,012.96
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de La Mar	51.81 KM	215,868.36	6.00	15,563.43
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Lucanas	112.63 KM.	575,632.51	0.00	0.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Parinacochas.	39.71 KM	204,900.98	0.00	0.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Sucre.	152.76 KM	845,462.48	8.00	64,165.20
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales de la Provincia de Vilcashuaman.	120.49 KM	581,630.55	5.00	33,993.25
TOTAL	736.78	3,794,240.00	28.50	170,598.02

Fuente: Dirección Estratégica Vial



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

CONSERVACION DE CARRETERAS

Nº	DESCRIPCIÓN	META FISICA ANUAL	UBICACIÓN GEOGRAFICA	PERIODO DE EJECUCION	PRESUPUESTO PROGRAMA	META FISICA EJECUTADA	AVANCE %
1	ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL ZONA NORTE Y CENTRO DE LA REGIÓN AYACUCHO	20.00	MULTIPROVINCIAL	ENERO-MARZO	120,000.00	20	100
2	ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL ZONA SUR DE LA REGIÓN AYACUCHO	20.00	MULTIPROVINCIAL	ENERO-MARZO	120,000.00	20	100
3	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA AY 106: EMP. PE A (QUEROBAMBA)-PAICO - SORAS - LARCAY - EMP. PE-30 B	60.00	QUEROBAMBA	ABRIL-SETIEMBRE	480,000.00	15.54	25.29
4	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA AY - 100: PACCHANCCA - SAN JOSÉ DE SECCE - MARCCARACCAY	20.00	HUANTA	ABRIL-JUNIO	160,000.00	0	0
5	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA AY -112: EMP. AY -111 (Ocaña)-TIRACANCHE-SONCONCHE.SAN PEDRO DE PALCO-OTOCA-SAN SEBASTIAN- (LD IC-112)	60.00	LUCANAS	JULIO-DICIEMBRE	471,994.00	2.3	3.95
6	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA AY-104 TRAMO "VILCASHUAMÁN - CARHUANCA"	40.00	VILCASHUAMÁN	OCTUBRE-DICIEMBRE	320,000.00	0	0
TOTAL		220.00	S/.		1,671,994.00	57.84	229.24



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

SERVICIOS DE TRANSPORTES.

ACTIVIDADES	META FISICA	AVANCE FISICO	% AVANCE
AUTORIZACIONES AL TRANSPORTE DE PERSONA	90	86	95.56
AUTORIZACION AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS	200	140	70.00
TARJETAS UNICAS DE CIRCULACION	880	380	43.18
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTES	332	176	53.01
PROCESO SANCIONADOR	200	71	35.50
TOTAL	1,702	853	50.12

LICENCIAS DE CONDUCIR

ACTIVIDADES	META FISICA	AVANCE FISICO	% AVANCE
LICENCIAS DE CONDUCIR NUEVAS	1,600	799	49.94
LICENCIAS DE CONDUCIR DE REVALIDACION	2,200	952	43.27
LICENCIAS DE CONDUCIR DE RECATEGORIZACION	1,000	474	47.40
LICENCIA DE CONDUCIR DUPLICADOS	1,200	381	31.75
TOTAL	6,000	2,606	43.43

TELECOMUNICACIONES.

- Instalación de recepción de televisión vía satélite y retransmisión de televisión y FM en baja potencia, para las localidades del Centro Poblado

Resumen Ejecutivo

de Santa Cruz de Ñuñunhuayco en Morochucos-Cangallo; con código SNIP 251276.

- Instalación de recepción de televisión vía satélite y retransmisión de televisión y FM en baja potencia, para las localidades del Centro Poblado de Chanqil en Morochucos-Cangallo; con código SNIP 251262.
- Instalación de recepción de televisión vía satélite y retransmisión de televisión y FM en baja potencia, para las localidades del Centro Poblado de Morcolla en Sucre; con código SNIP 256546.
- Instalación de recepción de televisión vía satélite y retransmisión de televisión y FM en baja potencia, para las localidades del Centro Poblado de Pampa Cangallo en Cangallo; con código SNIP 252115.



EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
REALIZANDO EL MONTAJE DE TORRE EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE
COLCA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO.

Resumen Ejecutivo



EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES INSTALANDO MASTIL Y LA ANTENA PARABOLICA EN LA COMUNIDAD QUILLA, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO.



INTERVENCIÓN A RADIO ILEGAL

Resumen Ejecutivo



EL ABOG. MAXIMO HUAMANI TINCO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN COORDINACIÓN CON LA DRA. ANA MARIA JAUREGUI ZUÑIGA FISCAL DE PREVENCIÓN DE DELITO, EN COORDINACIÓN PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE RADIO CALOR (EX – INKA SAT) EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO.

PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES , VERIFICANDO LOS EQUIPOS INCAUTADOS DE RADIO CALOR (EX -INKA SAT) EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, REGION AYACUCHO.

Resumen Ejecutivo

2.4. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.

PRINCIPALES LOGROS

Conclusión de la obra “Mejoramiento del Dique de tierra de Pampamarca y Cuchuquesera distrito de Chuschi – Cangallo – Ayacucho”.

LOGROS EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAS

MEJORAMIENTO DEL DIQUE DE TIERRA DE PAMPAMARCA Y CUCHUQUESERA (SNIP 192345).

- DISTRITO : CHUSCHI
- PROVINCIA : CANGALLO
- REGIÓN : AYACUCHO
- PRESUPUESTO: S/. 418,010 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DIEZ CON 00/100) NUEVOS SOLES.





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada



CAPACITACIONES	UNID.	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
			COMITÉ DE RIEGO	USUARIOS
Fortalecimiento de organización de usuarios	Eventos	198	13	1220
Mantenimiento y operación de infraestructura de riego	Eventos	82	13	850
Asistencia técnica y sensibilizaciones	Eventos	135	13	200
Capacitación en Sistema de riego parcelario	Eventos	85	13	826
Manejo ambiental	Eventos	35	13	437
Producción agropecuaria	Eventos	10	13	158
Manejo forestal/tara y pino	Plantones	15,100	7	--
otros eventos/faenas asambleas	Eventos	12	8	520
Manejo pecuario	Eventos	15	7	125

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

FECHA: JULIO 2013

Resumen Ejecutivo

CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DE OBRAS CAPACITACIÓN EN CAMPO in situ Y SOLICIÓN DE CONFLICTOS



RECONOCIMIENTO DE OBRA CON LOS BENEFICIARIOS





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS





Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

OBRAS CULMINADAS:

OBRAS CONCLUIDAS EN EL PRIDER										
Nº	Actividad Proyecto	CODIGO SNIP	PRESUPUEST EXPEDIENTE TECNICO	REPRESA		RESERVORIO		KM DE CANAL	% Ejecución Físico	% Ejecución Financiera
				CANT.	MM3	CANT.	M3			
1	Construcción de la Presa Pampacocha y Mejoramiento del Sistema de Riego Razuhuilca Huanta; U.R. Nº 6 Huanza.	68986	13,957,153.40			1.00	1,971.32	2.30	100.00%	100.00%
2	Mejoramiento del Sistema de Riego Hualla, Provincia de Víctor fajardo - Ayacucho.	79345	1,613,168.66			1	450	3,779	100.00%	100.00%
3	Construcción Canal Lateral Unidad de Riego Nº 02 – Chiara – Toma I, II, y III Provincia de Huamanga – Ayacucho.	95705	3,766,953.00			1.00	3,300.00	5.60	100.00%	100.00%
4	Ampliación y Mejoramiento del Canal Lateral U.R. Nº 06 Bellavista II Etapa Distrito Tambillo, Provincia de	83727	4,833,399.00					19.50	100.00%	100.00%



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

	Huamanga.									
5	Construcción de Canal Lateral Unidad de Riego N° 05 Toma 2 (Uchuypampa – Huatatas)- Tambillo.	119797	2,357,671.00					3.20	100.00%	100.00%
6	Construcción del Sistema de riego Tecnificado Huayao, Distrito de Chuschi-Cangallo - Ayacucho	137036	417,000.00			1.00	264.00	2.25	100.00%	100.00%
7	Construcción del Sistema de Riego Cerce Huertahuasi, Distrito de Chuschi- Cangallo- Ayacucho	139592	430,358.00					3.90	100.00%	100.00%
8	Ampliación del sistema de Riego en la Localidad de San José, Distrito de Colca, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho	203326	766,970.00			1.00	430.00	4.13	100.00%	100.00%
10	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego	11966	2,022,287.10	1	5				100.00%	100.00%



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Razhuillcca, Construcción de la Presa Chaccaccocha

OBRAS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:

OBRAS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA POR EL PRIDER										
Nº	Actividad Proyecto	CODIGO SNIP	PRESUPUEST EXPEDIENTE TECNICO	REPRESA		RESERVORIO		KM DE CANAL	% Ejecución Físico	% Ejecución Financiera
				CANT.	MM3	CANT.	M3			
1	Construcción del sistema de Riego de Masinga Dist. de Tambo - Provincia La Mar.	6268	11,313,783.00	1	2			23.14	88.00%	68.9%
2	Construcción de la Presa Pampaccocha y Mejoramiento del Sistema de Riego Razhuillcca Huanta; U.R. Nº 3 Paquecc	68986	13,957,153.40			1	7,236.35	7.55	25.84%	49.83%
3	Construcción Canal Lateral de la Unidad de Riego Nº 11 – Chontaca – Toma I,II y III Distrito de Acocro, Provincia de	88288	5,429,485.00				6,653.00	4.73	73.35%	86.90%



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

	Huamanga.									
4	Ampliación y Mejoramiento de Canal Lateral U.R. N° 07 Tambillo II, Etapa en el Sistema de Riego Ex Perc.	87235	9,883,005.00			1.00	1,500.00	16.00	72.19%	43.20%
						2.00	1,600.00			
5	Mejoramiento de la U.R. N° 09 Pantipampa, Tomas 01 y 02 – Distrito Acocro.	83610	6,190,469.00				8,500.00	7.13	94.00%	93.50%
6	Mejoramiento y ampliación del sistema de Riego de la Localidad de Carapo, Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos - Ayacucho	184633	1,843,100.00			1.00	1,980.00	4.30	98.30%	71.50%
7	Construcción del Canal de Riego Tomahuaycco - Chamanachimpa en la Comunidad de Chihuire, Distrito de Asquipata-Victor Fajardo- Ayacucho	172003	392,308.00			1.00	110.00	1.73	95.00%	84.10%



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

8	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Santa Rosa, Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga - Ayacucho	172276	2,874,647.00			1.00	4,231.00	6.00	62.15%	62.86%
9	Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuilcca, Construcción de la Presa Pampacocha	11966	5,833,897.89	1	1.7				95.44%	24.30%
10	Construcción del Sistema de Riego Laguna UStunacocha - Ccasanccay en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho	158841	34,360,841.00	1	1.5			21	2.40%	6.80%

94

OBRAS EN EJECUCION POR CONTRATA:

Actividad Proyecto	CODIGO SNIP	PRESUPUEST EXPEDIENTE TECNICO	REPRESA		RESERVORIO		KM DE CANAL	% Ejecución Físico Acumulado	% Ejecución Financiera Acumulado
			CANT.	MM3	CANT.	M3			



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Construcción del Sistema de Irrigación - Represa Pallcca, en el Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	38190	23,045,041,90	1	2.1			16.16	13.63%	61.1%
Construcción Del Sistema de Riego Pampas del Distrito de Luis Carranza, Provincia de La Mar - Ayacucho	104570	7,754,777.30	1	0.5	2	2500	19.4	31.32%	1.6%
Construcción de Represa Yanacocha en el Centro Poblado Manzanayocc, Distrito de Socos - Huamanga	177108	4,897,929.40	1	0.38			4.02	30.00%	45.80%
Ampliación de la Infraestructura de Riego de la Comisión de Regantes Ccelloccacca - Huachualla, Margen Derecha e Izquierda.	161893	4,150,024.18					11.2	84.72%	95.10%
Construcción del Sistema de Riego Curipampa, Distrito de Chumpi, Provincia de Parinacochas - Ayacucho.	75261	22,282,938.56	1	2.9			28.6	10.00%	72.60%



*Gestión con vocación
de Servicio*

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

2.5. OPEMAN.-

2.6. DIRECCIONES SUB REGIONALES.-

A. SUB REGION DE HUANTA.-

I. SECTOR AGRARIO:

NOMBRE DEL PROYECTO: "**CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN HUAYLLAY-LURICOCHA- HUANTA**".

CODIGO DEL SNIP: N° 34270

BENEFICIARIOS: En un total de 773 habitantes, agrupadas en 154 familias, beneficiándose para irrigar 160 hectáreas de la comunidad de Huayllay.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- ✓ Incrementar la Producción y Productividad Agrícola.
- ✓ Ampliar la frontera de áreas Agrícola.
- ✓ Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Extrema pobreza.

METAS FÍSICAS:

- ✓ Construcción de Mini Presa de Concreto Armado de 0.40MMC.
- ✓ Construcción del Canal de Conducción de Sección Circular Entubado de PVC UF C-5 de 5.0KM.
- ✓ Construcción de la Toma de Captación Quebrada con 02 ventanas de Derivación a ambas margines.
- ✓ Construcción de 02 Desarenadores en ambas margines.
- ✓ Construcción Canoa de Cruce Quebrada en 07 unidades.
- ✓ Construcción de Tomas Laterales Prediales en 10 Unidades.
- ✓ Construcción Pasarela Peatonal en 05 Unidades.
- ✓ Construcción de Carretera de Acceso en 4.5 Kilómetros.



Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Público Regional Descentralizado

Resumen Ejecutivo

Costo Total del Proyecto de acuerdo al Estudio Definitivo del Expediente Técnico es de **S/. 2'193,137.33 Nuevos Soles.**

MONTO DE INVERSIÓN HABILITADA

El Presupuesto habilitado es de S/ 1'335,998.00 Nuevo Soles que equivale a 60.92%.

AVANCE FÍSICO A LA FECHA

El Avance de la ejecución física acumulado del total de la Meta Física del proyecto es de 57.28% a la fecha.

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

El Presupuesto habilitado es de S/ 1'335,998.00 Nuevo Soles que equivale a 60.92%.

FOTOGRAFÍAS DESPUÉS DE HABER EJECUTADO O LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO: se adjunta

II. SECTOR TRANSPORTES:

NOMBRE DEL PROYECTO: "**CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO – TUPIN – CCARASENCCA – ESPINCUIY – RODEO PAMPA- CHUQUI- NUEVO PROGRESO – CCANOPATA – CCANO – DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**"

CODIGO DEL SNIP: N° 81132

MEMORIA DESCRIPTIVA:

BENEFICIARIOS: En un total de 16,848 habitantes de las 08 comunidades campesinas de **HUAYCHAO, TUPIN, CCARASENCCA, ESPINCUIY,**



Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

**RODEO PAMPA, CHUQUI, NUEVO PROGRESO, CCANOPATA y
CCANO** del distrito y provincia de Huanta.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Mejorar y fortalecer la interconexión vial mediante la construcción de una infraestructura de transporte dándole las condiciones adecuadas de transitabilidad entre las 08 Comunidades Campesinas del proyecto.
- Mejorar e Incorporar la producción agrícola de la zona al mercado local y regional, con la reducción de los costos de transporte y elevar el nivel de vida de los pobladores.
- Generar empleo temporal directo mediante las obras proyectadas.

METAS FÍSICAS:

Construcción de la carretera desde la comunidad de Huaychao, pasando por las comunidades de Tupín, Ccarasencca, Espincuy, Rodeo Pampa, Chuqui, Nuevo Progreso, Ccanopata y hasta llegar y conectar con la comunidad de Ccano, desarrollando las siguientes actividades:

- ✓ Corte con la Explanación de plataforma carretera de 20.72 Kilómetros.
- ✓ Pavimentación con el Perfilado y Compactación de la Rodadura de 20.72KM.
- ✓ Construcción de Obras de Arte:
 - Badén en 05 Unidades.
 - Alcantarillas TMC en 27 Unidades.
 - Muro de Contención en 120 m.l.
- ✓ Señalización:
 - Hitos de Kilometrajes en 20 Unidades.
 - Señales preventivas en 72 unidades



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

- Señales Informativas en 12 unidades.
- ✓ Impacto Ambiental en 3.62 hectáreas.
- ✓ Plan de Monitoreo Arqueológico en 30 Unidades.

MONTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTADA:

Costo Total del Proyecto de acuerdo al Estudio Definitivo del Expediente Técnico es de **S/. 5'906,416.10 Nuevos Soles**

MONTO DE INVERSIÓN HABILITADA

El Presupuesto habilitado es de S/ 2'700,000.00 Nuevo Soles que equivale a 45.71%.

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

El Avance de la ejecución física acumulado del total de la Meta Física del proyecto es de 22.35% a la fecha.

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

El Presupuesto habilitado es de S/1'790,944.10 Nuevo Soles que equivale a 30.32%.

**OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO TUPIN
ESPICUY RODEOPAMPA CCANOPATA -CCANO-HUANTA**

PRESUPUESTO DE OBRA

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

S/. 5.906.416.10

PRESUPUESTO ASIGNADO 2012

Recursos Ordinarios y Recursos Determinados

S/. 1,700.000.00



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

PRESUPUESTO ASIGNADO 2013

FTE. FTO.

Recursos Ordinarios

S/. 1,000.000.00

L



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo



VALORIZACION AL 30 DE JUNIO

CUADRO INFORMATIVO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACTUAL A LA FECHA

FUNCION : TRANSPORTE **PRESUPUESTO TOTAL:** S/. 5.906,416.10
PROYECTO : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO-TUPIN-ESPINCUIY-RODEOPAMPA-CCANOPATA-CCANO DE LA CIUDAD DE HUANTA – AYACUCHO” **PRESUPUESTO ASIGNADO 1° ETAPA:** S/. 703,146,00
COMPONENTE : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE **PRESUPUESTO ASIGNADO 2° ETAPA:** S/. 700.000,00
META : 00126 “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE –HUAYCHAO-TUPIN-ESPINCUIY-RODEOPAMPA-CCANOPATA-CCANO- PROVINCIA DE HUANTA”. **PRESUPUESTO ASIGNADO 3° ETAPA:** S/. 296,854,00
FECHA : 06/07/13 **PRESUPUESTO POR ASIGNAR:** S/. 1.000.000,00

META	ETAPA	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO		
		PRES. ASIGNADO	PRES. GASTADO	SALDO	% GASTADO	PRESUPUESTO TOTAL	% GASTADO DEL TOTAL	MONTO FISICO VALORIZADO	% FISICO VALORIZADO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	% FISICO VALORIZADO DEL PRESUPUESTO TOTAL
«CONSTRUCCION TROCHA CARROZA	PRIMERA ETAPA RO.	S/. 703,146,00	S/. 703,146,00	S/. 0,00	100,00%	S/. 2.700.000,00	100%	S/. 559.608.83	10,05%	10,05%
	SEGUNDA	S/. 700.000,00	S/. 27.517,00	S/.672,483,00	3.93%		3.93%			



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
 Población Regional Descentralizada

BLE-HUAYCHA O-TUPIN- ESPINCUY- RODEOPA MPA- CCANOPA TA- CCANO2	ETAPA RD.									
	TERCERA ETAPA RO.	S/. 296.854,00	S/. 240.986,30	S/. 55.867,70	81.18%		81.18%			
	CUARTA ETAPA RO.	S/. 1.000.000,00	S/. 819.294,81	S/. 180.705,19	81,93%		81.93%	S/. 641,548.89	12.30%	22,35%
TOTAL		S/. 2.700.000,00	S/. 1.790.944.10	S/. 909,055.89	70,77%			S/. 1,201,157.72		22.35%

103




Resumen Ejecutivo

B. SUB REGIÓN DE LUCANAS.-

C. SUB REGIÓN DE LA MAR.-

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL DE LA MAR, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO”

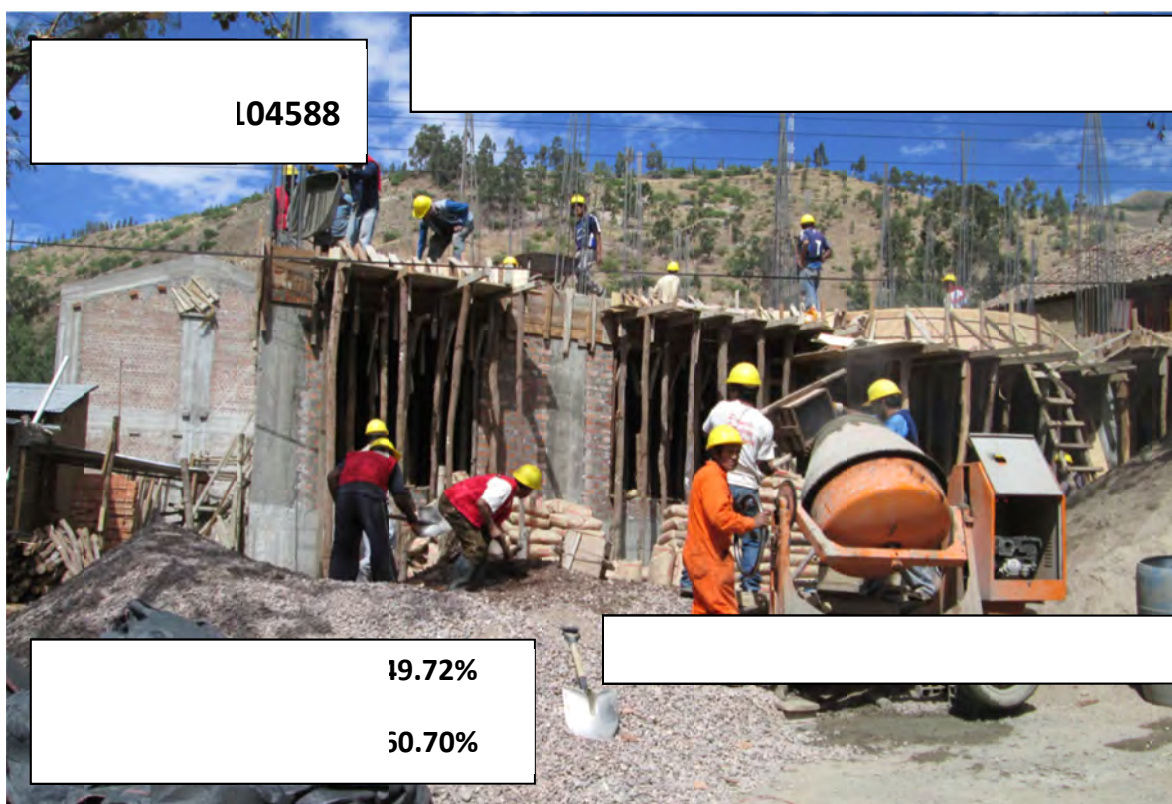

Resumen Ejecutivo

de
a:



;

creto:





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo



n de
ura:
!



Resumen Ejecutivo

reto
:



FICHA TECNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

1. IDENTIFICACIÓN

CODIGO SNIP	90896	FECHA: 24-05-2010
NOMBRE DEL PIP	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO – LA MAR – AYACUCHO"	
MONTO	S/. 1'489,871.22	
SECTOR	Gobiernos Regionales	
FUNCION	22 Educación	
PROD/PROY	2127655 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Virgen de las Nieves de	



Gestión con vocación de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

ACT/OBRA	Arwimayo, Distrito de Anco – La Mar – Ayacucho
META	4000037 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria 2127655 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Virgen de las Nieves de Arwimayo, Distrito de Anco – La Mar – Ayacucho



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Dotar de una infraestructura adecuada, para mejorar el nivel pedagógico de la Institución Educativa Virgen de las Nieves de Arwimayo
- Lograr una mayor cobertura de la población estudiantil en el nivel secundario
- Mejorar el nivel educativo de la población estudiantil, mejorando así las condiciones de vida
- Disminución de la Tasa de Analfabetismo

Generar empleo temporal durante el proceso productivo.

3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO. RD – 2012, OINFES - 2012

4. DESCRIPCION DE LA META TOTAL

- La Meta integral del Proyecto abarca la Construcción de una nueva infraestructura con material noble en 02 Niveles; techo tipo losa aligerada con cobertura de teja andina, los cuales comprende la construcción de: 05 Aulas Pedagógicas + 01 Dirección y Secretaría, 01 Biblioteca y 01 Sala de cómputo
- Construcción de obras complementarias como: Servicio Higiénico, Tanque Elevado y Cisterna, Losa Deportiva, Cerco Perimétrico, Caja de Escalera con acceso al 2do. Nivel y Equipamiento (Computadoras, Mobiliario Escolar para alumnos y Escritorios para Docentes)
- La edificación ha sido estructurada y diseñada en el objetivo de lograr y garantizar un buen comportamiento frente a los sismos, para lo cual se han



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

seguido los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de Edificación vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. COSTO DEL PROYECTO

EN NUEVOS SOLES	EN DOLARES (cambio = S/. 2.726)
S/. 1'489,871.22	\$ 546,541.16

6. SITUACION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO AL 2012			SALDO PRESUPUESTAL			SALDO TOTAL
PIA	PIM	EJECUTAD O	PIA	PIM	EJECUTADO	
400,000.00	1'072,799.00	1'072,798.68	417,072.54	0.00	417,072.54	--

7. AVANCE FISICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA AL 31-07-2013

DESCRIPCION	META EJECUTADA %	SALDO %
Aulas Pedagógicas + Dirección	85.00	15.00
Biblioteca y Sala de Cómputo	85.00	15.00
Caja de Escalera	75.00	25.00



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

Cerco Perimétrico	80.00	20.00
Servicio Higiénico	90.00	10.00
Losa Deportiva Implementada	20.00	80.00
Tanque Elevado y Cisterna	90.00	10.00
Trabajos Exteriores	50.00	50.00
Equipamiento	0.00	100.00
AVANCE FISICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%)	77.00	23.00

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

TIEMPO DE EJECUCION	270 Días (09 Meses)
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	16-05-2012
FECHA DE INICIO DE OBRA	16-05-2012
FECHA DE CULMINACION	31-08-2013
AMPLIACION DE PLAZO	No previsto
NUEVA FECHA DE TERMINO	No previsto

Resumen Ejecutivo



Vista Panorámica culminado a nivel de Estructura



Estructura cuberturado con Teja Andina y Pintado con Material Base de los Muros Interiores y Exteriores

Resumen Ejecutivo



Cerco Perimétrico en proceso de construcción con Ladrillo de Arcilla Tipo Soga y Caravista



Resumen Ejecutivo

Celosías instaladas en el Ingreso Principal de la I.E. y Apertura de la Calle adyacente



Vista Panorámica del Servicio Higiénico y del Tanque Elevado construidos





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Terreno Explanado para la construcción de la Losa Deportiva

D. SUB REGIÓN DE PAUCAR DE SARA SARA.-

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INCUYO – PAUZA DE LA PROVINCIAS DE PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP N° : 157063

MONTO DE INVERSION APROBADO : 10'452,431.15

MONTO EJECUTADO A LA FECHA : 5'200,000.00 (DEL AÑO 2010 AL2013)

BENEFICIARIOS : 12,500BENEFICIARIOS (aproximadamente)

META GLOBAL : 47+720 KM (DE INCUYO KM 0+000 A PAUZA KM47+720)

AVANCE FISICO A LA FECHA : 63.40%

AVANCE FINANCIEROA LA FECHA : 49.75%

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUTOR : GRA – OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

AÑO 2013

- Trabajos de Explanación de material suelto del **Km 26+720 al KM 22+180**

Volumen de metros cúbicos en Explanación de Material Suelto

57,000.00 M3 aproximadamente

Volumen de metros cúbicos en voladura Meta 2013

- Trabajos de perforación y Voladura entre el KM 26+720 al KM 13+380.
- Roca fija : 8,125.00 M3



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

- Roca suelta : 21,250.00 M3
- **Avance físico Meta 2013** : 15.79%
- **Avance financiero Meta 2013** : 11.48% (S/ 1'200,000.00 NS)

RESUMEN

EJECUCION FISICA - FINANCIERA ACUMULADO AL 2013

Ejecución física acumulada : 63.40 %

Ejecución física financiera acumulada : 49.75 %

RESUMEN DE SALDO FISICO – FINANCIERO POR EJECUTAR

Saldo físico por ejecutar : 36.60 %

Saldo financiero por ejecutar : 50.25 %

3.- ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA “CARRETERA INCUYO - PAUZA

De la meta Física global se ha ejecutado la explanación de material suelto con maquinaria pesada y servicios de perforación y voladura; así como la construcción de obras de arte en lo referente a la ampliación y mejoramiento de la **carretera Incuyo - Pauza del KM 44+770 al Km 2+980** con un promedio de plataforma de 8.00 metros.

PANEL FOTOGRAFICO DE LA CARRETERA INCUYO – PAUZA EX ANTES

Resumen Ejecutivo



Tramo críticos de la carretera incuyo – pauza en el km 40+500 al km 40+620 con un talud de roca y una plataforma existente de 3.50 metros de ancho; requiere de los servicios de perforación y voladura para ensanchar la plataforma a 8.00 metros de ancho conforme, las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado de la obra “mejoramiento de la carretera incuyo – pauza de las provincias parinacochas y paucar del sara sara”

Resumen Ejecutivo



Proyecto:

“AMPLACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA REGION AYACUCHO”

CODIGO SNIP N° : 186885

MONTO DE INVERSION APROBADO : 9'981,720.00

MONTO EJECUTADO A LA FECHA : 5'593., 673.00

BENEFICIARIOS : 7,500 BENEFICIARIOS

META GLOBAL : INFRAESTRUCTURA I.E MARIANO MELGAR – PAUZA

AVANCE FISICO A LA FECHA : 30 %

Resumen Ejecutivo

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA : 60%

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA

EJECUTOR : CONSORCIO MELGAR

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR – DISTRITO PAUZA; OBRA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL PRESENTE AÑO 2013 POR EL CONTRATISTA CONSORCIO MELGAR

3



ANTES EJECUCION DE LA OBRA SE DISPONIA DE
INFRAESTRUCTURA DE ATERIAL DE LA REGION

Resumen Ejecutivo



EJECUCION DE LA OBRA I.E MARIANO MELGAR





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

PROYECTO: “RECUPERACION DE LA I.E JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARASARA REGION AYACUCHO”

CODIGO SNIP N° : 183782

AVANCE FISICO A LA FECHA : 30 %

MONTO DE INVERSION APROBADO : 4'108,418.00

MONTO EJECUTADO A LA FECHA : 2'225,868.00

BENEFICIARIOS : 1,500 BENEFICIARIOS

META GLOBAL : INFRAESTRUCTURA I.E JOSE

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA : 60%

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA

EJECUTOR : CONSORCIO ARGUEDAS

Resumen Ejecutivo

OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA – DISTRITO LAMPA, OBRA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL PRESENTE AÑO 2013 POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ARGUEDAS





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

Proyecto: “AMPLIACIÓN DEL AUDITORIUM NRO 24300 N-MX-P DEL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA – AYACUCHO”.

Monto de Inversión : S/. 354,245.57

Beneficiarios: 2 500 personas beneficiadas directa e indirectamente.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivo General.

El objetivo principal del proyecto es:

- ❖ Mejorar el nivel cultural de la comunidad de Pausa.

Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos del presente proyecto son:

- ❖ Dotar al Centro Educativo de una infraestructura acorde a los tiempos modernos de un Auditorium adecuado y seguro para el buen desarrollo de sus actividades académicas.
- ❖ Brindar a la comunidad de Pausa de una infraestructura amplia, moderna y segura para el desarrollo de las actividades culturales y sociales.
- ❖ Reducir los Niveles de Analfabetismo.
- ❖ Mejorar el Nivel de Vida de la población beneficiada.

Resumen Ejecutivo

RESUMEN DE PRESUPUESTO.

El presupuesto para la presente Obra: “**AMPLIACIÓN DEL AUDITORIUM NRO 24300 N-MX-P DEL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**” asciende a un monto Total de Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 57/100 (S/. 354,245.57) Nuevos Soles, con el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO	:	S/.	324,695.57
GASTOS GENERALES	:	S/.	20,700.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	:	S/.	8,850.00
COSTO TOTAL DE OBRA	:	S/.	354,245.57



Resumen Ejecutivo

Avance Financiero: 100%

Financiamiento:

Esta obra será financiada por :

- Programa Trabaja Perú.....80%
- Aliado Estratégico 2.....20%

5



E. SUB REGIÓN DE HUANCASÁNCOS.-

F. SUB REGIÓN DE SUCRE.-

G. SUB REGIÓN DE VILCASHUAMÁN.-

H. SUB REGIÓN DE VICTOR FAJARDO.-

I. SUB REGIÓN DE CANGALLO.-

J. SUB REGIÓN DE PARINACOCHAS.-

2.7. UNIDADES OPERATIVAS.-

A. UNIDAD OPERATIVA DEL VRAEN.-

META 182: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO”. SNIP N° 84808

PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2012	S/. 1,364,309.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2013	S/. 416,063.20
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO	S/. 1,780,372.20
PRESUPUESTO ACTUALIZADO:	S/. 1,822,200.00

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1,687.

VISTA COMPLETA DE LOS MODULOS QUE CUENTAN 02 AULAS, 01 CENTRO DE COMPUTO, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, SALA MULTIUSO, DIRECCION-SECRETARIA, SS.HH. GUARDIANIA Y PATIO MULTIUSO.





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTEERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO”.

AVANCE FISICO:	79.50%
AVANCE FINANCIERO:	96.65%

3





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo





Gestión con vocación
de Servicio

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

META 170: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 38452/MX-P DE LA COMUNIDAD RINCONADA BAJA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO". CODIGO SNIP N° 133298.

PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2012	S/. 1,408,528.00	PRESUPUESTO
HABILITADO AÑO 2013	S/. 309,799.67	
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO	S/. 1,718,327.67	

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 695.





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 38452/MX-P DE LA COMUNIDAD RINCONADA BAJA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”.

AVANCE FISICO:	100%
AVANCE FINANCIERO:	99.87%



Resumen Ejecutivo

META 068: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N° 38599/Mx-P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL , PROVINCIA LA MAR. SNIP N° 163538

• EXPEDIENT. TEC. REFORMULADO:	S/.	4,613,087.00
• PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2012	S/.	2,644,980.00
• PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2013	S/.	1,033.280.61
○ TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO	S/.	3,678,260.61

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 8,574.



MOD. I = 03 AULAS, 01 DIRECCION, 01 SECRETARIA, 01 ORIENTACION AL ESTUANTE Y 01 ALMACEN. MOD. II = 03 AULAS, 02 LABORATORIO DE COMPUTO Y 01 LABORATORIO DE CIENCIAS.

Resumen Ejecutivo

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N°
38599/Mx-P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAN
MIGUEL , PROVINCIA LA MAR.**

AVANCE FISICO:	80.84%
AVANCE FINANCIERO:	99.11%



MOD. III = 07 AULAS, 01 AUDITORIUM Y 01 BIBLIOTECA.

Resumen Ejecutivo

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.N° 38599/Mx-P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO
DE SAN MIGUEL , PROVINCIA LA MAR.**

AULAS ANTIGUAS



NUEVAS AULAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

META: 128: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE DE COMUNPIARI DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO. SNIP N° 176522

COSTO TOTAL DE LA OBRA:	S/. 1,268,483.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2012	S/. 600,000.00
PRESUPUESTO HABILITADO AÑO 2013	S/. 668.442.66
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO	S/. 1,268,442.66



NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1,013.



Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE DE COMUNPIARI
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO.

AVANCE FISICO:	65.12%
AVANCE FINANCIERO:	99.98%



MOD. I = 2DO. NIVEL DE AULAS EXISTENTES = 02 AULAS, GUARDIANA Y ESCALERA DE ACCESO. MOD. II =
01 DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE ESPERA, BIBLIOTECA, 01 AULA, CENTRO DE COMPUTO,
LABORATORIO, SALA DE DOCENTES Y SS.HH.

Resumen Ejecutivo

AULAS ANTIGUAS



NUEVAS AULAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION





Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

B. UNIDAD OPERATIVA DE LAS CABEZADAS.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO HABILITADO 2013	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	META	CÓDIGO SNIP
1	MEJORAMIENTO DE IRRIGACION TASTACHAYOCC SAISA	S/ 1'086,973.00	36%	65%	127 familias	190	11843
2	CONSTRUCCIÓN DE MINIREPRESA CARHUANAYRE OTOCA	S/ 814,288.00	40%	61%	375 familias	132	67820
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA LLAUTA HUANCASANCOS	S/ 782,977.00	OBRA PARALIZADA				

3



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC-SAISA

FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
PROYECTO : MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC-
SAISA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Región : Ayacucho
Provincia : Lucanas
Distrito : Saisa
Localidad : Saisa, Buena Vista
Modalidad de Ejec. : Ejecución Presupuestaria Directa
PRESUPUESTO BASE : S/. 3'055,270.28 Nuevos soles
PPTO.HABILITADO 2013. : S/. 814,288.00
PLAZO DE EJECUCIÓN : 8.0 MESES

META FISICA PARA EL AÑO 2013

Revestimiento de canal sección trapezoidal con concreto de 2,887 metros, aprox.

Del canal aductor complementadas con las siguientes obras:

- 01 Bocatomas en la quebrada Ccaccachea (Herrana).
- 01 Desarenador en la progresiva 0+002 Km.
- 01 Medidor RBC en la Progresiva 0+010 Km.
- Canal rápida 60 ml con su respectivo pozo disipador prog. 0+820 Km.

La conclusion de la presa de Gravedad "Tastachayocc – Saisa", para un volumen de almacenamiento de **0.74 MMC**, con sus respectivas obras conexas.



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

CONSTRUCCION MINI REPRESA CARHUANAYRE-OTOCA

FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
META : 132 "CONSTRUCCION MINI REPRESA
CARHUANAYRE"

DESCRIPCIÓN GENERAL

Región : Ayacucho
Provincia : Lucanas
Distrito : Otoa
Localidad : Uruizaccasa - Carhuanayre
Modalidad de Ejec. : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE : S/. 2'903,491.42 Nuevos soles
PPTO HABILITADO 2013 : S/. 1'086,973.00 Nuevos soles
PLAZO DE EJECUCIÓN : 8.0 meses

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente proyecto es "INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS SECTORES DE CARHUANAYRE", mediante el proyecto de implementación de una infraestructura mayor de riego en el Distrito de Otoa, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Resaltando la obtención de información a través de los diferentes agentes que intervienen en la formulación como: la Municipalidad Distrital de Otoa y el Gobierno Regional de Ayacucho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Población Regional Descentralizada

Incrementar la productividad agrícola con la construcción de la Mini Represa Carhuayanre en la comunidad campesina del mismo nombre.

Construcción de Tubería de conducción y sus respectivas obras de arte.

Mitigar el Impacto Ambiental que pueda ser producido por el proyecto, además de capacitar a los pobladores – beneficiarios, mediante un plan acorde a la realidad de la zona y costumbres de la población.



OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA LLAUTA HUANCASANCOS

SECTOR	: 99 Gobiernos Regionales
PLIEGO	: 444 Gobierno Regional Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA	: 001 Sede Ayacucho – Unidad Operativa Las Cabezadas
FUNCION	: 16 TRANSPORTES
PROGRAMA	: 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA	: 0142 Construcción y Mejoramiento Carreteras
FECHA	: PALPA, JULIO 2013

DESCRIPCIÓN GENERAL

Región	: Ayacucho
Provincia	: Lucanas
Distrito	: Llauta
Localidad	: Llauta
Modalidad de Ejec.	: Administración Directa
PRESUPUESTO BASE	: S/. 2'903,491.42 Nuevos soles
PPTO HABILITADO 2013	: S/. 786,973.00 Nuevos soles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 8.0 meses



Gestión con vocación
de Servicio

Resumen Ejecutivo

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

El proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Palpa – Llauta – Huanca Sancos”, se ha organizado para un adecuado desarrollo de las actividades de los componentes, que a continuación se prosigue a describir:

a. CONSTRUCCION DE VARIANTES

- a.1 Construcción de Variante Llauta – Huicuta – Pucará 13.10 Km.
- a.2 Construcción de Variante Huamanilla 0.80 Km

b.- MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS

- b.1 Mejoramiento de tramo Huamanilla - Collanco.
- b.2 Mejoramiento de tramo Tacarpo
- b.3 Rehabilitación de Badén en las quebradas Usipa y Tibica en Km 31+260 y Km 36+100
- b.4 Mejoramiento de Curvas de Volteo
- b.5 Rehabilitación de Plazoletas de Cruce

En el presente año con el fin de consumir los servicios comprometidos y contando en obra materiales de construcción tales como cemento fierro y agregados se continúa con la ejecución de los trabajos; alcantarillas, así como compactado y perfilado de la plataforma de la variante: Llauta-Huicuta-Pucará y Construcción de Baden el sector Collanco (Km. 36+100 Carretera Palpa-Llauta-Huanca Sancos), priorizándose esta porque el badén existente años antes fue deteriorado y que sólo anualmente se rellena para el acceso a la zona la misma que en temporada de lluvias se deteriora interrumpiendo el acceso a los distritos de Huac-huas, Llauta, Laramate y Huanca Sancos.

Actualmente esta carretera ha sido declarada vía nacional, PROVIAS NACIONAL realizará la actividad de Rehabilitación mediante contrata. Por cuya razón la obra ha sido paralizada.



*Gestión con vocación
de Servicio*

1^{ra} AUDIENCIA
Pública Regional Descentralizada

Resumen Ejecutivo

